

CONS. DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

pag. 1

GIORNALE DEI LAVORI

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

IMPRESA: C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

Giornale dei Lavori n. 7

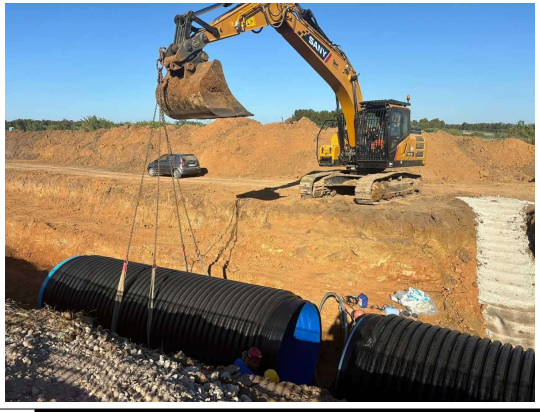
L'IMPRESA
C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. FRANCESCO CASTAGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ANGELO SERAFINO MELONI

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

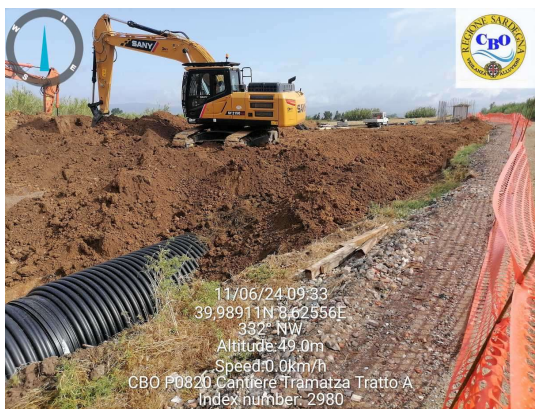
DATA e METEO	ANNO TAZ IONI G E N E R A L I E S P E C I A L I SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
03/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori: è proseguito lo scavo del terreno per la posa della condotta nel tratto A e si è iniziato a posare il ferro dell'armatura della platea della vasca di fine intervento del medesimo tratto.
04/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzà è stata completata la posa del ferro dell'armatura della platea della vasca di fine intervento del tratto A e quella del muro del gradone (castellatura parete vasca). Inoltre, è stato posato il primo tubo della condotta. 04/06/2024  <i>P0820 Cantiere Tramatzà - Armatura platea vasca fine intervento tratto A e muro parete by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 04/06/2024  <i>P0820 Cantiere Tramatzà - Armatura platea vasca fine intervento tratto A e muro parete by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 04/06/2024  <i>P0820 Cantiere Tramatzà - Armatura platea vasca fine intervento tratto A e muro parete by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
05/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	04/06/2024  <i>P0820 Cantiere Tramatz a - Armatura platea vasca fine intervento tratto A e muro parete by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .</i>
	05/06/2024  <i>P0820 Cantiere Tramatz a - Getto platea vasca fine intervento tratto A, muro parete e posa tubi by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .</i>
	05/06/2024  <i>P0820 Cantiere Tramatz a - Getto platea vasca fine intervento tratto A, muro parete e posa tubi by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	05/06/2024  P0820 Cantiere Tramatz a - Getto platea vasca fine intervento tratto A, muro parete e posa tubi by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 05/06/2024  P0820 Cantiere Tramatz a - Getto platea vasca fine intervento tratto A, muro parete e posa tubi by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 06/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI In data odierna visita dell'assistente di cantiere presso il sito di Tramatz a; prosegue la posa dei tubi della condotta DN 1800 (n.8) del tratto A e l'armatura di una delle pareti della vasca di fine intervento (muro). Due operai dell'impresa continuano ad assistere l'archeologa Sanna che prosegue lo scavo della antica tomba ritrovata nei pressi della vasca di inizio intervento dello stesso tratto. Presenti la Sindaca e la Vice sindaca di Tramatz a e il Resp.Tecnico dello stesso Comune. 06/06/2024  P0820 - Posa tubi tratto - vasca fine intervento - scavo area archeologica by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	06/06/2024  06/06/24 10:42 39.98967N 8.62561E 233° SW Altitude: 54.2m Speed: 1.1 km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto A Index number: 2965 P0820 - Posa tubi tratto - vasca fine intervento - scavo area archeologica by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 06/06/2024  06/06/24 10:49 39.98980N 8.62550E 151° SE Altitude: 58.8m Speed: 0.0 km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto A Index number: 2971 P0820 - Posa tubi tratto - vasca fine intervento - scavo area archeologica by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 06/06/2024  06/06/24 10:53 39.98889N 8.62525E 36° NE Altitude: 57.3m Speed: 0.0 km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto A Index number: 2975 P0820 - Posa tubi tratto - vasca fine intervento - scavo area archeologica by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	06/06/2024  06/06/24 10:42 39.98966N 8.62562E 217° SW Altitude: 53.9m Speed: 0.7km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Index Number: 2964 P0820 - Posa tubi tratto - vasca fine intervento - scavo area archeologica by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 06/06/2024  06/06/24 10:22 39.98792N 8.62509E 247° SW Altitude: 56.6m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Index Number: 2960 P0820 - Posa tubi tratto - vasca fine intervento - scavo area archeologica by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
11/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nella mattinata odierna presso il cantiere di Tramatzza si è svolto un sopralluogo alla presenza del RUP (Dott. Meloni), DL (Ing. Castagna e Geol. Sanna), Comune di Tramatzza (Sindaca e Tecnico comunale), Soprintendenza Archeol. (dott. Usai) e Referente incarico sorveglianza archeologica (Archeol. Sanna) per fare il punto riguardo al ritrovamento del sito archeologico in corrispondenza della vasca di inizio intervento del TRATTO A: con nota trasmessa al CBO lo scorso 7 giugno la Soprintendenza ha autorizzato il Consorzio alla prosecuzione dei lavori, considerato che le attività di pulizia e repertazione dell'archeologa incaricata sono terminati e che i reperti sono stati consegnati al CBO, a parte le pietre costituenti l'antica tomba ritrovata custodite dal Comune di Tramatzza presso Casa Enna. I lavori di posa delle tubazioni del Tratto A è proseguita tra venerdì 7 e lunedì 10 giugno con complessivi 15 tubi DN 1800 già sistemati; proseguono anche le attività di cantiere di armatura, intelaiatura e cassetatura della vasca di fine intervento. In corrispondenza della vasca di inizio intervento e del canale di scolo trasversale alla nuova condotta, l'interferenza sempre trasversale con condotta DN 600 mm verrà gestita entro qualche giorno realizzando i lavori di scavo per la posa del nuovo tubo, mettendo in sicurezza il tubo preesistente che attualmente fornisce l'erogazione idrica ai terreni di quest'area irrigua.

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	11/06/2024  11/06/24 09:32 39.98865N 8.62539E 338° N Altitude: 51.4m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto A Index number: 2979 P0820 TRATTO A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 11/06/2024  11/06/24 09:33 39.98911N 8.62556E 332° NW Altitude: 49.0m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto A Index number: 2980 P0820 TRATTO A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 11/06/2024  11/06/24 09:34 39.98953N 8.62572E 335° NW Altitude: 43.2m Speed: 2.9km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto A Index number: 2983 P0820 TRATTO A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

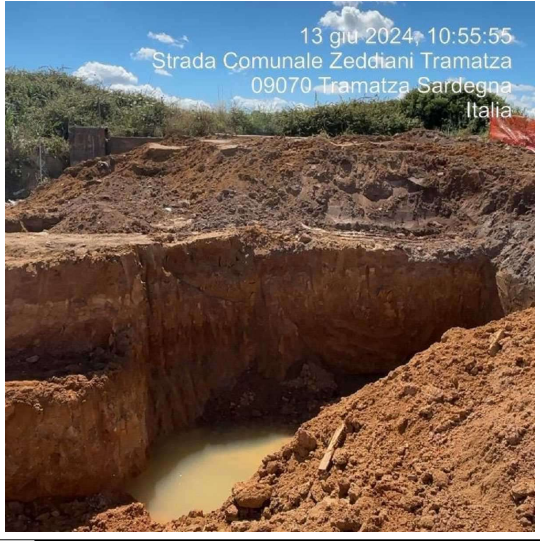
DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	11/06/2024  P0820 TRATTO A - Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 11/06/2024  P0820 TRATTO A - vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 11/06/2024  P0820 TRATTO A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	11/06/2024  11/06/24 09:32 39.98856N 8.62536E 277° W Altitude: 49.3m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Index number: 2978 P0820 TRATTO A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 11/06/2024  11/06/24 09:32 39.98860N 8.62534E 287° W Altitude: 49.8m Speed: 0.2km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Index number: 2977 P0820 TRATTO A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 12/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Le attività del cantiere di Tramatzza con 3 escavatori e n. 6 operai, oltre l'operaio della ditta che ha fornito i tubi spiralati (Centraltubi), sono andate avanti con la prosecuzione dello scavo relativo alla vasca di inizio intervento Tratto A, con l'intelaiatura ed armatura della vasca di fine intervento e con la copertura dei tubi DN 1800 già posati utilizzando il terreno in precedenza scavato. 12/06/2024  12/06/24 11:11 39.98860N 8.62550E 113° SE Altitude: 54.3m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Can. Add. Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3045 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	12/06/2024  12/06/24 11:10 39.98968N 8.62570E 179° S Altitude: 56.4m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Can. Add. Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3041 P0820 Cantiere Tramatzà Tratto A - Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 12/06/2024  12/06/24 11:13 39.98880N 8.62547E 329° NW Altitude: 50.5m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Can. Add. Tratto A Index number: 3050 P0820 Cantiere Tramatzà Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 12/06/2024  12/06/24 11:13 39.98887N 8.62550E 236° SW Altitude: 48.6m Speed: 1.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Can. Add. Tratto A Index number: 3052 P0820 Cantiere Tramatzà Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	12/06/2024 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 12/06/2024 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 12/06/2024 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A - Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
13/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	12/06/2024  12/06/24 11:22 39.98782N 8.62502E 357° N Altitude 56.5m Speed 0.6km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Can. Add. Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 3065 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 13/06/2024  13 giu 2024 10:56:08 Strada Comunale Zeddiani Tramatzza 09070 Tramatzza Sardegna Italia P0820 Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	13/06/2024  P0820 Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
14/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita nel cantiere di Tramatzza del Direttore dei lavori: getto di calcestruzzo dei muri perimetrali della vasca di inizio intervento del Tratto A , mentre nel Tratto B sono iniziate le attività di pulizia dell'area di posa della nuova condotta con posizionamento dei relativi picchetti dell'asse del tubo. Sono stati anche scaricati i tubi DN 1800 da utilizzare per la condotta. 14/06/2024  P0820 - Tratto A - Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/06/2024  17/06/24 10:24 39.99752N 8.62375E 129° SE Altitude: 58.4m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto B Index number: 3122 P0820 - Tratto B by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/06/2024  17/06/24 10:25 39.99752N 8.62358E 129° SE Altitude: 58.4m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto B Index number: 3123 P0820 - Tratto B by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/06/2024  17/06/24 10:24 39.99753N 8.62374E 233° SW Altitude: 58.0m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto B Index number: 3120 P0820 - Tratto B by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

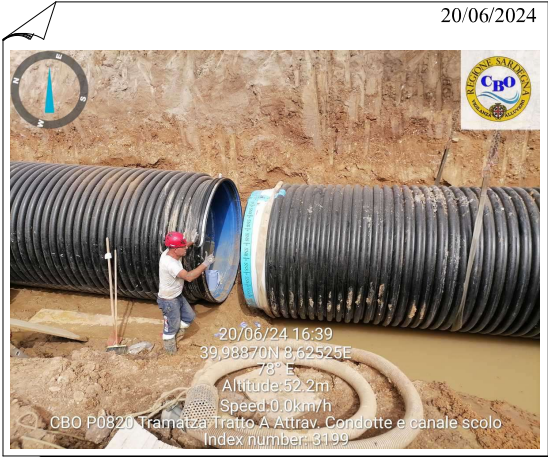
DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
19/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	17/06/2024  17/06/24 10:25 39.99751N 8.62357E 202° S Altitude: 58.9m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto B Index number: 3122 P0820 - Tratto B by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 19/06/2024  19/06/24 11:14 39.98950N 8.62561E 334° NW Altitude: 59.8m Speed: 0.5km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3128 P0820 - Cantiere Tramatzà Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 19/06/2024  19/06/24 11:15 39.98951N 8.62553E 94° E Altitude: 59.2m Speed: 1.1km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3130 P0820 - Cantiere Tramatzà Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	19/06/2024    19/06/24 11:14 39.98950N 8.62571E 335° NW Altitude:60.8m Speed:0.0km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3127 P0820 - Cantiere Tramatzza Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 19/06/2024    19/06/24 11:17 39.98953N 8.62568E 68° E Altitude:58.4m Speed:0.0km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3135 P0820 - Cantiere Tramatzza Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 19/06/2024    19/06/24 11:26 39.98833N 8.62521E 219° SW Altitude:49.1m Speed:0.0km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 3137 P0820 - Cantiere Tramatzza Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

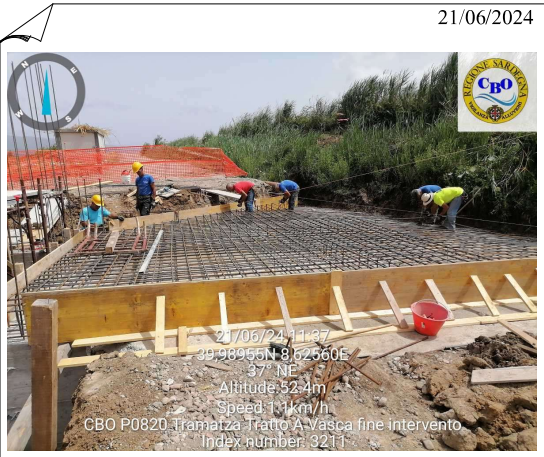
DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	20/06/2024  20/06/24 11:32 39.98862N 8.62527E 174° S Altitude: 47.5m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzia Tratto A Attrav. Condotte e canale scolo Index number: 3166 P0820 Cantiere Tramatzia - Posa tubazione DN 1800 mm tratto interferenza DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 20/06/2024  20/06/24 13:58 39.98854N 8.62527E 41° NE Altitude: 53.6m Speed: 0.5km/h CBO P0820 Tramatzia Tratto A Attrav. Condotte e canale scolo Index number: 3169 P0820 Cantiere Tramatzia Posa tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 20/06/2024  20/06/24 14:00 39.98873N 8.62541E 264° W Altitude: 55.0m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzia Tratto A Attrav. Condotte e canale scolo Index number: 3172 P0820 Cantiere Tramatzia Posa tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	20/06/2024  20/06/24 14:05 39.98847N 8.62530E 7° N Altitude: 56.1m Speed: 0.6km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto A Attrav. Condotte e canale scolo Index number: 3178 P0820 Cantiere Tramatzà Posa tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 20/06/2024  20/06/24 14:09 39.98843N 8.62525E 324° NW Altitude: 56.5m Speed: 0.0km/h P0820 Tramatzà Tratto A Attrav. Condotte e canale scolo Index number: 3183 P0820 Cantiere Tramatzà Posa tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	20/06/2024  P0820 Cantiere Tramatzia Posa tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .
21/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: questa mattina l'impresa ha proseguito nel Tratto A di progetto con il completamento del ricoprimento della nuova condotta DN 1800 mm, in corrispondenza dell'interferente preesistente condotta DN 600 mm e del canale di scolo, mentre un'altra squadra della CE.SI. che opera in corrispondenza della vasca di fine intervento sta realizzando l'armatura del fondo vasca. 21/06/2024  P0820 Cantiere Tramatzia - ricoprimento tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 21/06/2024  P0820 Cantiere Tramatzia - ricoprimento tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

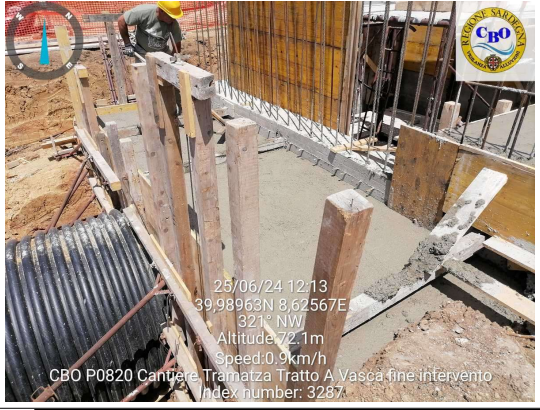
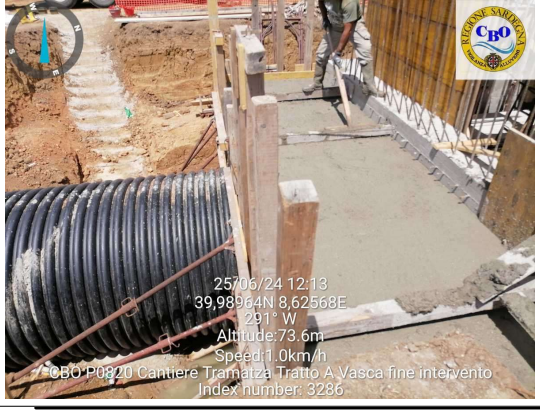
DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	21/06/2024  21/06/24 11:33 39.98883N 8.62543E 320° SW Altitude: 54.5m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto A Inter. Condotta DN 600 e scolo Index number: 3203 P0820 Cantiere Tramatzà - ricoprimento tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 21/06/2024  21/06/24 11:32 39.98850N 8.62531E 320° NW Altitude: 52.1m Speed: 0.6km/h CBO P0820 Tramatzà Tratto A Inter. Condotta DN 600 e scolo Index number: 3202 P0820 Cantiere Tramatzà - ricoprimento tubo DN 1800 mm Tratto A interf. DN 600 mm e canale scolo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 21/06/2024  P0820 Cantiere Tramatzà - armatura fondo vasca fine intervento Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
24/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	21/06/2024  21/06/24 14:27 39.98955N 8.62560E 37° NE Altitude: 52.4m Speed: 1.1km/h CBO P0820 Tramatzia Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3211 P0820 Cantiere Tramatzia - Tratto A Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/06/2024  24/06/24 12:36 39.98858N 8.62525E 47° NE Altitude: 57.6m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzia Tratto A Inter. Condotta DN 600 e scolo Index number: 3217 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/06/2024  24/06/24 12:37 39.98851N 8.62526E 45° N Altitude: 49.0m Speed: 0.3km/h CBO P0820 Tramatzia Tratto A Inter. Condotta DN 600 e scolo Index number: 3218 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) Visita del direttore dei lavori: è proseguito lo scavo della nuova condotta DN 1800 mm in corrispondenza della vasca di inizio intervento del Tratto A ed è stato completato il ricoprimento con terra della stessa condotta nel tratto interferente con la tubazione esistente DN 600 mm. Anche la sistemazione dell'armatura e delle casseforme nella vasca di fine intervento del medesimo tratto A è stata ulteriormente portata avanti.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/06/2024  24/06/24 12:38 39,98861N 8,62531E 338° N Altitude: 52.1m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Inter. Condotta DN 600 e scolo Index number: 3223 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/06/2024  24/06/24 12:37 39,98837N 8,62525E 234° SW Altitude: 52.4m Speed: 0.6km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Inter. Condotta DN 600 e scolo Index number: 3219 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/06/2024  24/06/24 12:39 39,98838N 8,62521E 188° S Altitude: 53.6m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 3225 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/06/2024    24/06/24 12:45 39.98958N 8.62566E 26° NE Altitude: 54.1m Speed: 0.9km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3227 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	24/06/2024    24/06/24 12:47 39.98955N 8.62553E 51° NE Altitude: 56.9m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3231 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	24/06/2024    24/06/24 12:46 39.98956N 8.62562E 23° NE Altitude: 53.4m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Tramatzza Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3229 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
25/06/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel cantiere di Tramatzza (Tratto A) è stato completato il ricoprimento della parte di condotta DN 1800 tra la vasca di fine intervento e l'interferenza con la condotta DN 600 e canale di scolo. E' proseguito lo scavo dell'altra parte di tratto verso la vasca di inizio intervento dove è stato intercettato un altro tubo in PVC DN 250, rompendolo, trasversale alla direzione della nuova condotta da posare. L'impresa sentito anche il DL e l'Ufficio Reti provvederà alla riparazione della tubazione intercettata.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	25/06/2024  25/06/24 11:52 39,98840N 8,62523E +197° S Altitude: 49.6m Speed: 0.0km/h P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 3282 <i>P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - Tubazione interferente DN 250 mm danneggiata by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 25/06/2024  25/06/24 12:15 39,98950N 8,62566E +192° N Altitude: 62.5m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A vasca fine intervento Index number: 3295 <i>P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	25/06/2024  25/06/24 12:13 39.98962N 8.62571E 359° N Altitude: 64.6m Speed: 1.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3290 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 25/06/2024  25/06/24 12:13 39.98963N 8.62567E 321° NW Altitude: 72.1m Speed: 0.9km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3287 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - vasca fine intervento blocco di ancoraggio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 25/06/2024  25/06/24 12:13 39.98964N 8.62568E 291° W Altitude: 73.6m Speed: 1.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca fine intervento Index number: 3286 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A - vasca fine intervento blocco di ancoraggio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	25/06/2024 P0820 Cantiere Tramatzà Tratto A - vasca fine intervento blocco di ancoraggio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
