



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 - Oristano

Lavori di sistemazione e potenziamento della
viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del Tirso in
corrispondenza del ponte del Rimedio

SERVIZIO PIENA "SOMMA URGENZA E ATTIVITA' MANUTENTIVE URGENTI" ANNUALITA' 2022

C.A.T. P0622

C.U.P.: G11B22002150002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Francesco Castgna

Collaboratori
Geom. Matteo Casciu
Geol. Stefano Sanna

Responsabile Unico del Progetto
Dott. Agr. Antonio Serafino Meloni

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

DIAGRAMMA DI GANTT

V.1

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
01	10/2024	1530P0622diaggantFC		

ALLEGATO "A"

Comune di Oristano
Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di sistemazione e potenziamento della viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del tirso in corrispondenza del ponte del Rimedio

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica.

CANTIERE: S.P. N. 93, Oristano (OR)

Oristano, 09/10/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Castagna Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Presidente Corrias Dott. Carlo)

Ingegnere Castagna Francesco


Via Cagliari n.170
09170 Oristano (OR)
Tel.: 07833150 - Fax: 07833150
E-Mail: castagnaf@bonificaoristanese.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L
Preparazione delle aree di cantiere	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4
Realizzazione della viabilità di cantiere	5
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	3
Apprestamenti del cantiere	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2
Posa di segnaletica stradale temporanea	2
Impianti di servizio del cantiere	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	2
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2
Scavo di sbancamento	13
Sede stradale	
Formazione di rilevato stradale	36
Formazione di fondazione stradale	28
Opere d'arte	
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	2
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1
Opere complementari	
Posa di segnaletica verticale	1
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1
Smobilizzo del cantiere	5
LEGENDA: gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro	

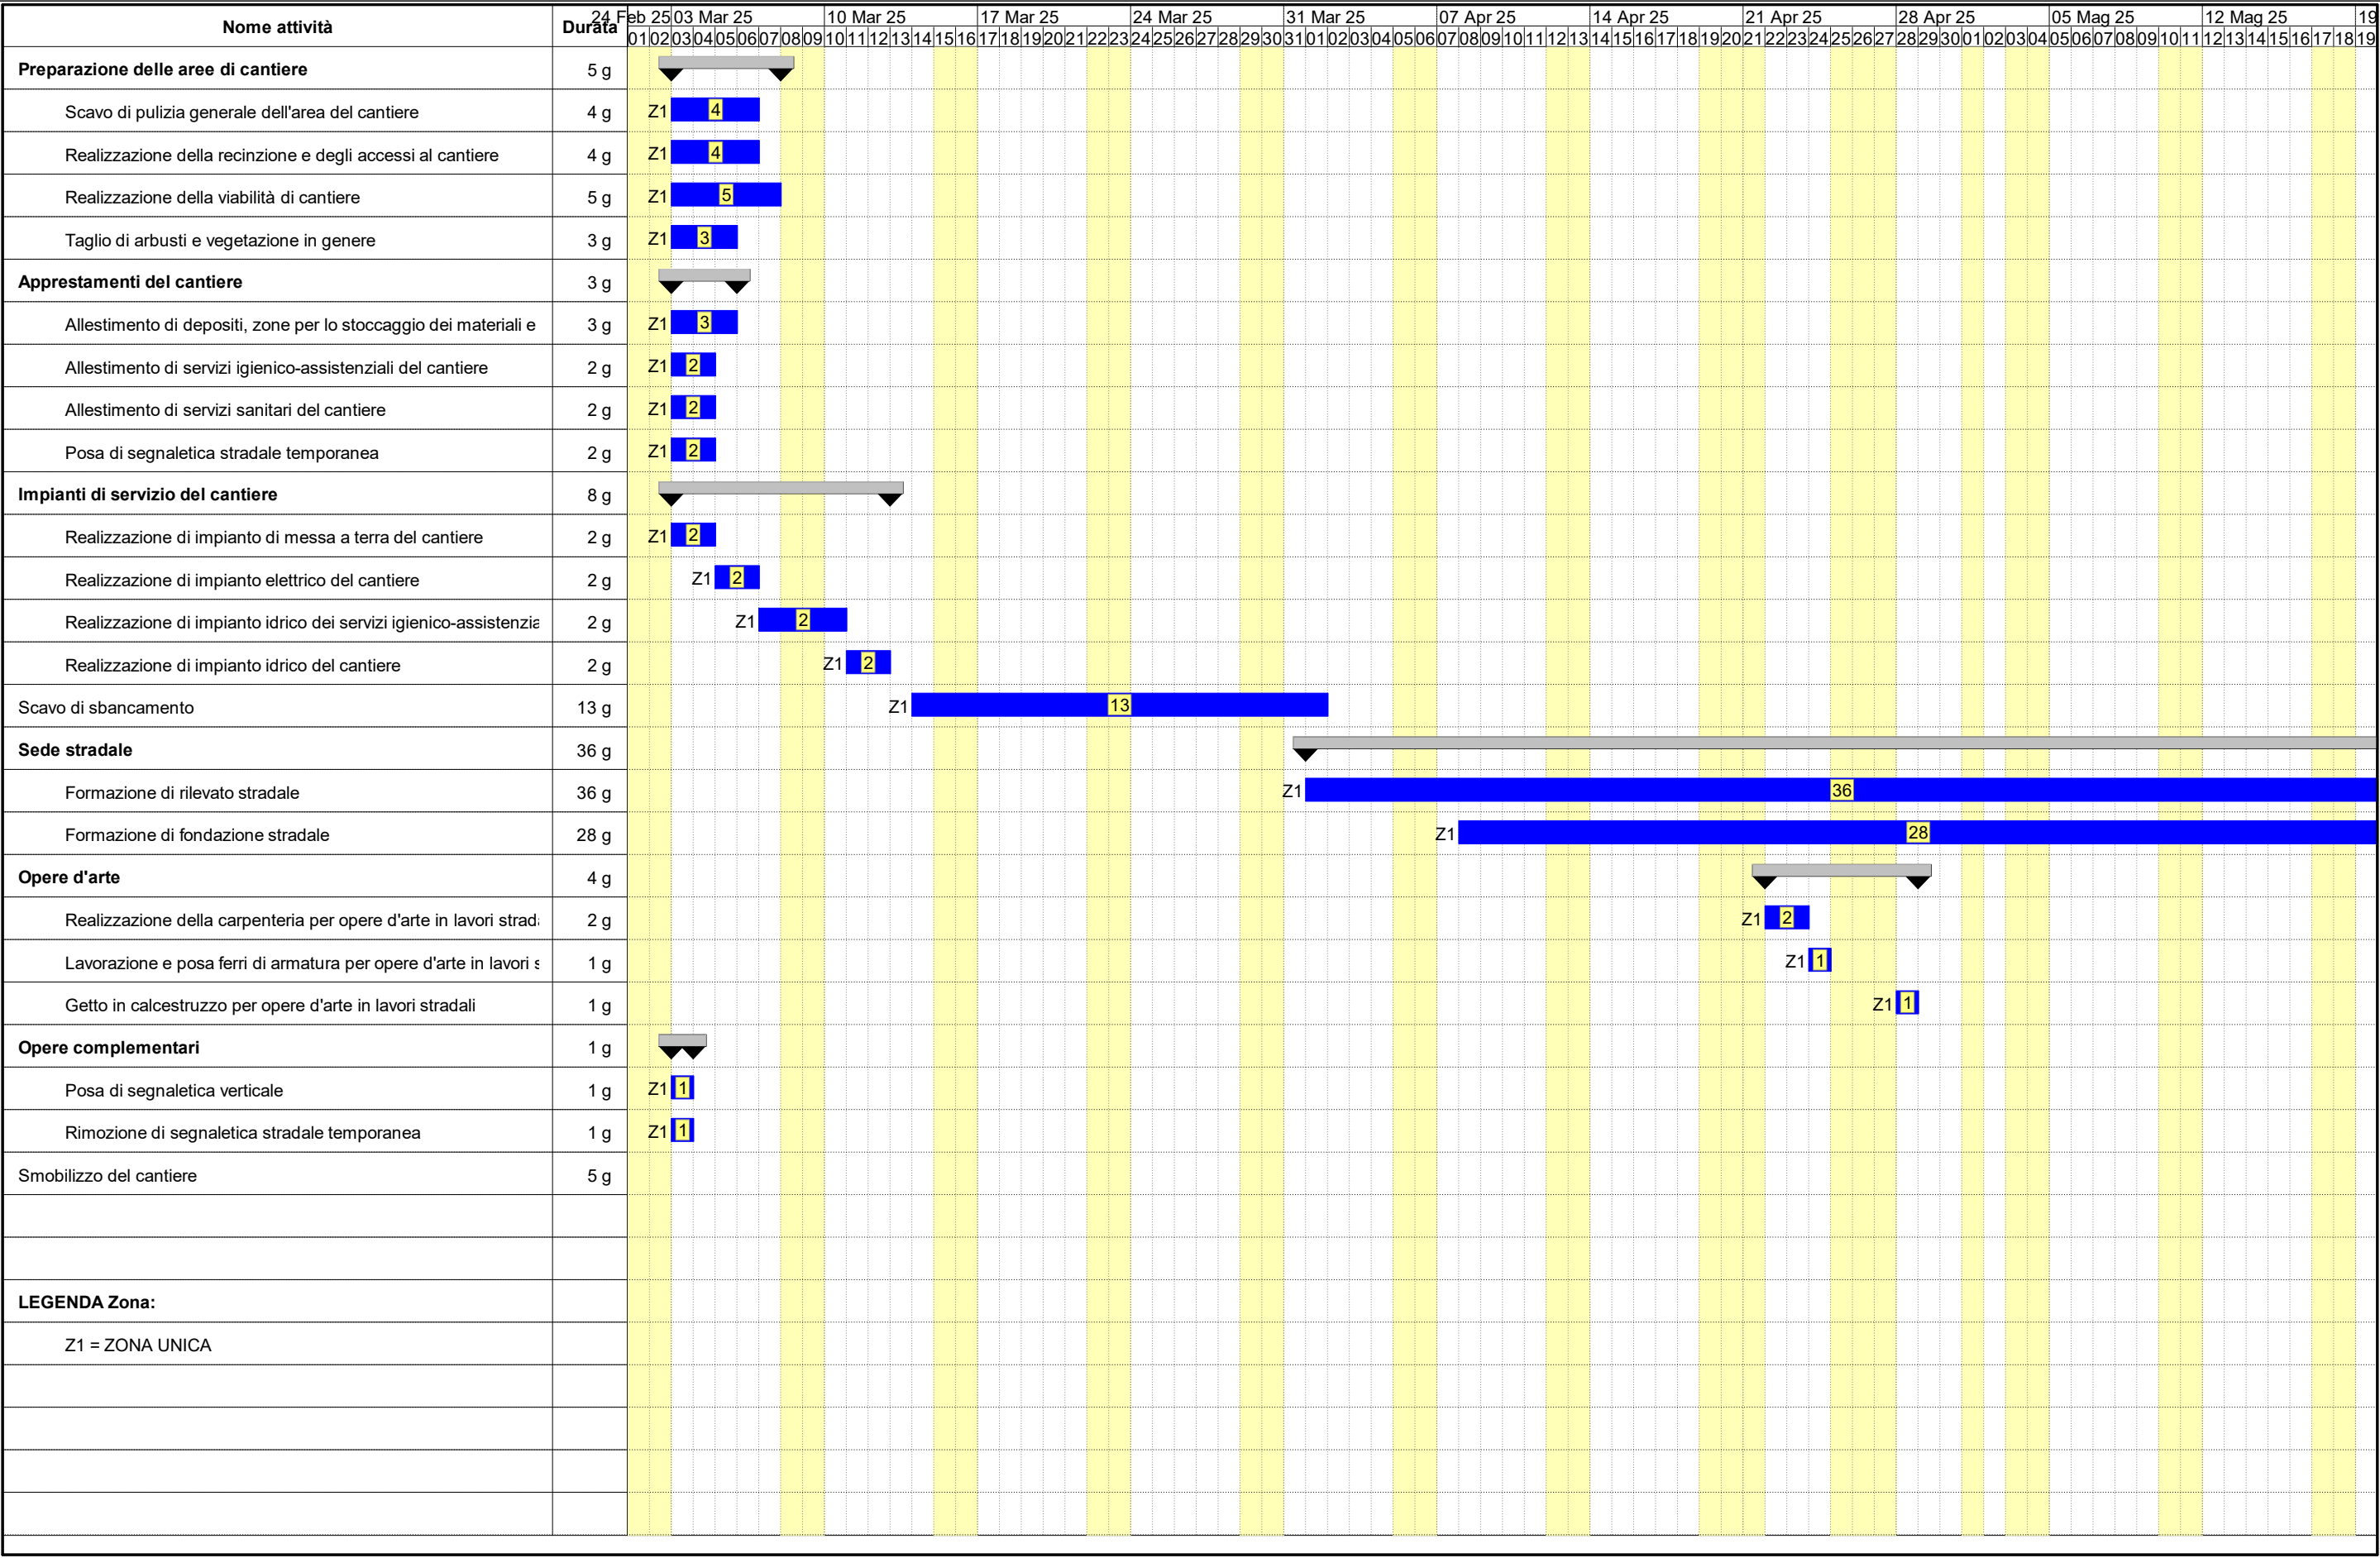

19 Mag 25 26 Mag 25 02 Giu 25 09 Giu 25 16 Giu 25 23 Giu 25 30 Giu 25 07 Lug 25 14 Lug 25 21 Lug 25 28 Lug 25 04 Ago 25 11 Ago 25 18 Ago 25 25 Ago 25 01 Set 25

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04

36

28

Z1 5
