

CONS. DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

pag. 1

GIORNALE DEI LAVORI

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

IMPRESA: C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

Giornale dei Lavori n. 2

L'IMPRESA
C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. FRANCESCO CASTAGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ANGELO SERAFINO MELONI

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
12/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Si è svolto un incontro con la Società C.E.S.I. per valutare una ulteriore proposta riguardo le tubazioni da utilizzare per la realizzazione del nuovo tratto intubato, rispetto a quella presentata in sede di gara che prevedeva tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, non in pressione. La soluzione presentata, invece, considera tubi spiralati in polietilene/ polipropilene a parete strutturata in poli non plastificati, ma non rinforzato in acciaio e non in pressione. Al fine di valutare meglio l'ultima proposta presentata, la DL chiede all'impresa di effettuare una comparazione tra le due soluzioni (quella di gara e la attuale) per verificare il permanere dei requisiti tecnici dei tubi presentati in sede di offerta ed eventualmente accettare tali materiali costituenti i tubi del tratto della rete dell'Adduttore destra Tirso.
18/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	L'impresa CESI ha realizzato a monte e a valle del Rio Mare 'e foghe n. 2 carotaggi (S1 e S2), di profondità 10 metri ciascuno, per verificare nel dettaglio la stratigrafia in corrispondenza dell'attraversamento del rio, in particolare sino alla profondità di circa 5 metri. Dagli esiti dei carotaggi, sia da una parte che dall'altra, si sono riscontrati sino a circa 5-5,50 metri dei limi argillosi che dovrebbero garantire un agevole lavoro alla ditta specializzata che realizzerà per conto della stessa CESI la condotta con la tecnica dello spingi-tubo esclusivamente in quello specifico tratto.



Localizzazione carotaggio S1 by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

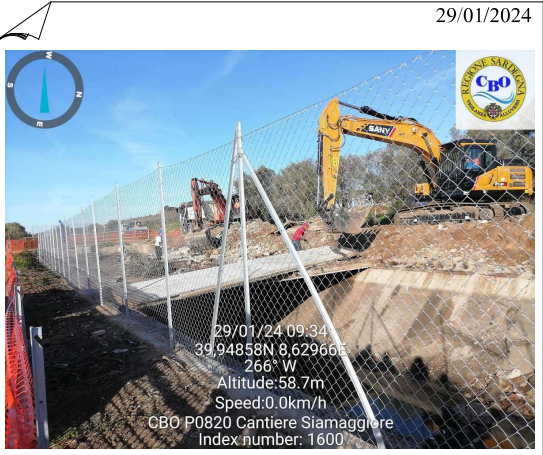
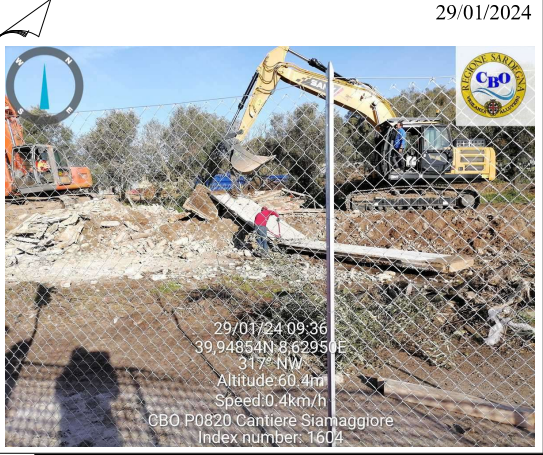


Stratigrafia 0-5 metri carotaggio S1 by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	18/01/2024  Stratigrafia 5-10 metri carotaggio S1 by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 18/01/2024  Localizzazione carotaggio S2 by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 18/01/2024  Localizzazione carotaggio S2 - Dettaglio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	18/01/2024  18/01/24 12:56 39.99467N 8.62467E 207° SW Altitude: 51.5m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Indagini verifica stratigrafia Rio mare foghe impresa CESI S2 Index number: 1566 Stratigrafia 0-5 metri carotaggio S2 by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 18/01/2024  18/01/24 12:56 39.99462N 8.62466E 207° SW Altitude: 51.5m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Indagini verifica stratigrafia Rio mare foghe impresa CESI S2 Index number: 1577 Stratigrafia 5-10 metri carotaggio S2 by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
24/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Incontro presso la sede del CBO con il Geom Sabiu e Sig. Andrea Macis della CESI per fare il punto sui lavori appaltati e in particolare: a) riguardo alle opere di attraversamento del rio Mare foghe l'impresa ha prospettato una videochiamata tra il geolo Strinna che ha eseguito i carotaggi nei giorni scorsi e la ditta (subappalto) campana che dovrà realizzare la condotta con lo spingitubo; b) si è definito di svolgere congiuntamente una visita nel cantiere di Siamaggiore (stombamento e impermeabilizzazione) lunedì 29 gennaio; c) riguardo alla comparazione delle caratteristiche tecniche dei tubi da utilizzare per il canale di nuova realizzazione (proposta di gara e nuova proposta), la DI si riserva di verificare la documentazione acquisita informalmente e nei prossimi giorni, previa verifica, dovrà essere trasmessa con PEC per l'autorizzazione della nuova proposta; d) la DI informa, infine, che è in fase di firma da parte del Dirigente della Determinazione di approvazione del decreto di occupazione d'urgenza delle aree di intervento.
29/01/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Sopralluogo alle ore 9 presso il cantiere di Siamaggiore (intervento su canale tombato) del D.L. Ing. Castagna e dell'Ass. di cantiere Geol. Sanna per la verifica dell'andamento dei lavori, iniziati da alcuni giorni, alla presenza del capo cantiere Geom Bruno Sabiu (impresa CESI). Sino ad ora, oltre alla pulizia e al disboscamento lungo le fasce di entrambe le sponde del canale, è in fase di completamento la rimozione e il trasporto in discarica autorizzata delle lastre di c.a.p. di copertura del canale, nel tratto più a est dell'area di intervento. A seguire la stessa lavorazione per gli altri due tratti di canale tombato, rispettivamente più a monte, oltre il ponte di Via S. Pietro, e quello in prossimità della S.P. 12. Nei prossimi giorni si effettuerà un altro sopralluogo congiunto DL/Impresa per la misurazione delle quantità di lavorazioni svolte alla data dei rilievi.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	29/01/2024  29/01/24 09:07 39,94861N 8,62925E 122° SE Altitude:64.0m Speed:1.3km/h CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Index number: 1579 P0820 Rimozione lastre in c.a.p. 1 tratto Canale tombato Siamaggiore by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 29/01/2024  29/01/24 09:09 39,94858N 8,62966E 288° W Altitude:60.6m Speed:0.5km/h CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Index number: 1581 P0820 Rimozione lastre in c.a.p. 1 tratto Canale tombato Siamaggiore by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 29/01/2024  29/01/24 09:11 39,94921N 8,63110E 182° S Altitude:59.2m Speed:0.0km/h CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Index number: 1583 P0820 Rimozione lastre in c.a.p. 1 tratto Canale tombato Siamaggiore by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	29/01/2024  29/01/24 09:34 39.94858N 8.62966E 266° W Altitude: 58.7m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Index number: 1600 <i>P0820 Rimozione lastre in c.a.p. 1 tratto Canale tombato Siamaggiore by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 29/01/2024  29/01/24 09:36 39.94854N 8.62950E 317° NW Altitude: 60.4m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Index number: 1604 <i>P0820 Rimozione lastre in c.a.p. 1 tratto Canale tombato Siamaggiore by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>
