

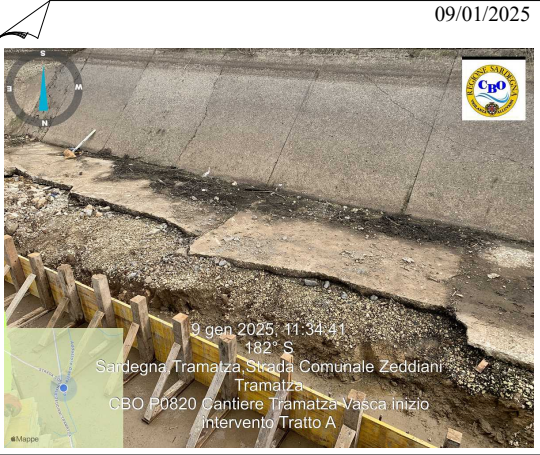
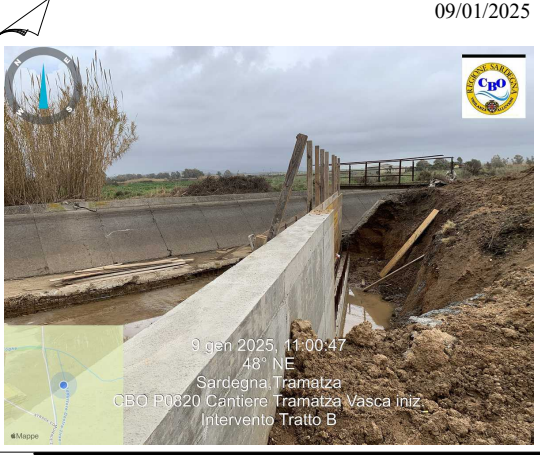
DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
03/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatzza dopo la pausa per le festività natalizie: le imprese CE.SI. e Tecnoattraversamenti che operano in questo cantiere non hanno ancora ripreso l'attività che verrà riavviata con molta probabilità il 7 gennaio prossimo. Presente in cantiere un operaio della CE.SI. per il controllo giornaliero delle attrezzature e dei macchinari presenti in cantiere e per attivare le pompe nella camera di spinta del microtunnelling in modo tale da aspirare l'acqua accumulata.
07/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzza la ditta Tecnoattraversamenti che si occupa per conto della CE.SI. della predisposizione delle tubazione in sotterraneo al di sotto del Rio Mare 'e foghe ha ripreso questa mattina l'attività con il riavvio dei lavori del microtunnelling.
09/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: 1) nel cantiere di Tramatzza proseguono le attività, in particolare nel Tratto A è in corso la pulizia e il riordino della parte interna della vasca di inizio intervento e si predispone per la realizzazione del gradino vasca -canale, compreso il fondo dello stesso canale adduttore; nella vasca di inizio intervento del Tratto B si inizia a predisporre l'armatura e la casserratura dei muri di collegamento vasca-canale, così come nella vasca di fine intervento dello stesso Tratto B. Infine, nella camera di spinta del microtunnelling del Tratto B proseguono i lavori di avanzamento del sistema di sistemazione dei tubi-camicia DN 2400 mm con n. 11 di questi ultimi, oltre la cellula, infissi nel terreno al di sotto del Rio mare 'e foghe all'ora del sopralluogo, a cura della ditta Tecnoattraversamenti Srl e la Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl e il supporto della CE.SI. Srl U.. 2) nel cantiere di Siamaggiore l'impresa CE.SI. ha iniziato l'attività di pulizia dei tratti di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura lo scorso anno e nei quali si realizzeranno nelle prossime settimane i lavori di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde.



P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto A Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

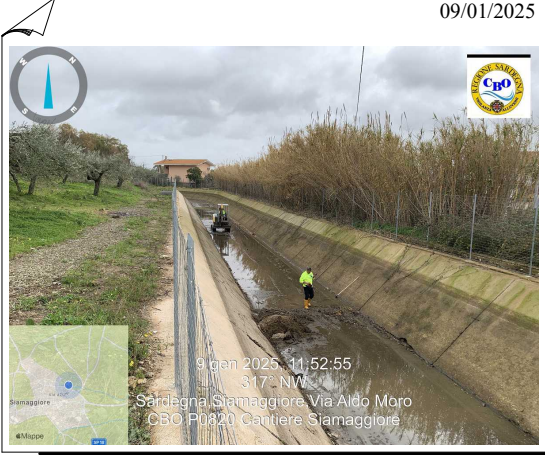
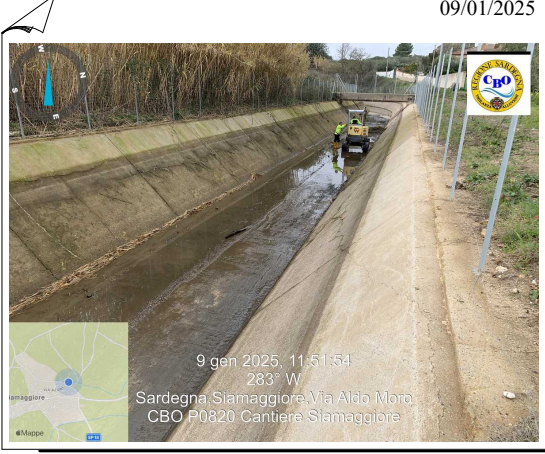


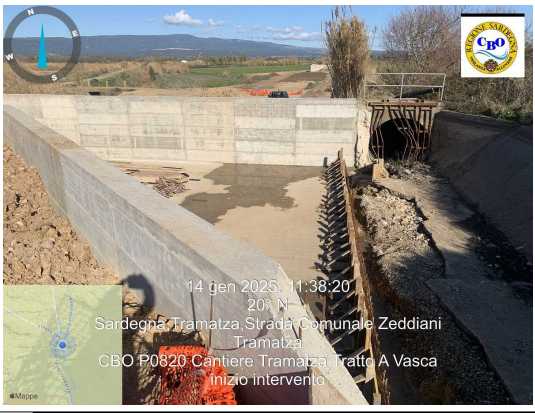
P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto A Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	09/01/2025  P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto A Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 09/01/2025  P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 09/01/2025  P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	09/01/2025 9 gen 2025, 11:01:05 40° NE Sardegna, Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Vasca iniz. Intervento Tratto B <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 09/01/2025 9 gen 2025, 11:04:10 2° N Sardegna, Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Camera spinta microtunnelling Tratto B <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 09/01/2025 9 gen 2025, 11:04:50 13° N Sardegna, Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Camera spinta microtunnelling Tratto B <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

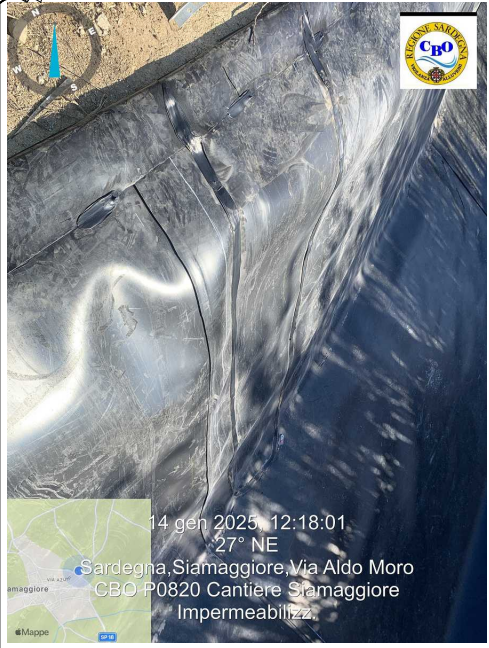
DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	09/01/2025  9 gen 2025, 11:05:06 328° NW Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Camera spinta microtunnelling Tratto B P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 09/01/2025  9 gen 2025, 11:54:09 296° NW Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore P0820 Cantiere Siamaggiore - Canale adduttore dx by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	09/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Canale adduttore dx by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 09/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Canale adduttore dx by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 09/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Canale adduttore dx by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
14/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	09/01/2025  9 gen 2025, 11:51:47 314° NW Sardegna Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore <i>P0820 Cantiere Siamaggiore - Canale adduttore dx by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .</i> Visita del Direttore dei lavori: 1) nel cantiere di Tramatzu questa mattina sono presenti solo le imprese Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl per le lavorazioni del sistema di sistemazione dei tubi-camicia DN 2400 mm con avanzamento di n. 12 di questi ultimi, oltre la cellula, infissi nel terreno al di sotto del Rio mare 'e foghe; nella giornata di ieri 13 gennaio, l'impresa CE.SI. srl ha proseguito i lavori di armatura del gradino di collegamento vasca -canale adduttore dx della vasca di inizio intervento del Tratto A e dei muri di collegamento nella vasca di inizio intervento del Tratto B; 2) nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G Impermeabilizzazioni hanno iniziato l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde di un tratto di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura lo scorso anno e contemporaneamente prosegue la pulizia di altre parti di canale da impermeabilizzare. In alcune parti di canale, sia nel fondo che nelle sponde, a causa di evidenti lesioni del calcestruzzo, prima dell'impermeabilizzazione sono previsti i risanamenti per la regolarizzazione dei relativi profili. 14/01/2025  14 gen 2025, 11:38:20 203° N Sardegna Tramatzu, Strada Comunale Zeddiani Tramatzu CBO P0820: Cantiere Tramatzu, Tratto A Vasca inizio intervento <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Canale Add. DX Tratto A Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	14/01/2025  14 gen 2025, 11:46:13 16° N Sardegna,Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Camera spinta microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatza - Canale Add. DX Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 14/01/2025  14 gen 2025, 12:14:24 4° N Sardegna,Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizz. <i>P0820 Cantiere Siamaggiore canale add. DX Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 14/01/2025  14 gen 2025, 12:14:11 37° NE Sardegna,Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizz. <i>P0820 Cantiere Siamaggiore canale add. DX Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

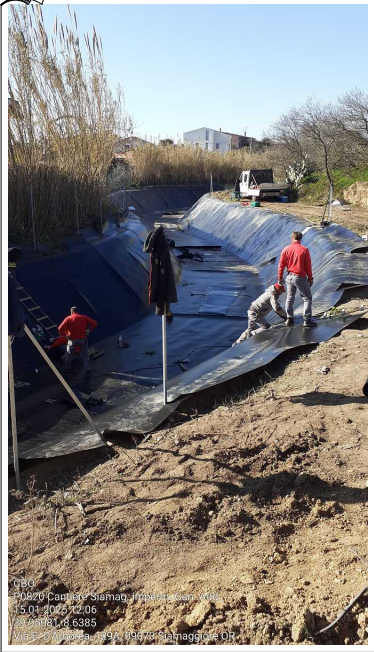
DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	14/01/2025 <i>P0820 Cantiere Siamaggiore canale add. DX Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 14/01/2025 <i>P0820 Cantiere Siamaggiore canale add. DX Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 14/01/2025 <i>P0820 Cantiere Siamaggiore canale add. DX Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

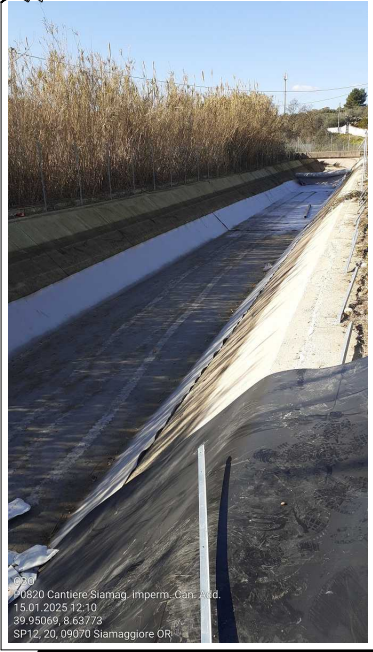
DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	14/01/2025  14 gen 2025, 12:18:01 27° NE Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizz. P0820 Cantiere Siamaggiore canale add. DX Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 14/01/2025  14 gen 2025, 12:16:02 7° N Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizz. P0820 Cantiere Siamaggiore canale add. DX Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
14/01/2025	 14 gen 2025, 12:11:40 33° NE Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizz <i>P0820 Cantiere Siamaggiore canale add. DX Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>
15/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Proseguono lentamente, a causa di problemi tecnici nel sistema del microtunnelling, le attività nel cantiere di Tramatzza con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl che portano avanti le lavorazioni del sistema dei tubi-camicia DN 2400 mm con avanzamento di n. 13 di questi ultimi, oltre la cellula, infissi nel terreno al di sotto del Rio mare 'e foghe; l'impresa CE.SI. srl prosegue i lavori di armatura d dei muri di collegamento nella vasca di inizio intervento del Tratto B. Nella giornata di ieri, invece, sono stati avviati i lavori di armatura della platea del fondo della vasca di fine intervento del Tratto B. Nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni proseguono l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde di un tratto di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura oltre che la pulizia di altre parti di canale da impermeabilizzare.  15 gen 2025, 13:07:56 36° NE Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B vasca inizio intervento <i>P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO	
	15/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 15/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 15/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	15/01/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 15/01/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 15/01/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	15/01/2025  CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 15.01.2025 12:06 39.9508, 8.6385 Via E. D'Arborea, 129A - 09070 Siamaggiore OR P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 15/01/2025  CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 15.01.2025 12:08 39.9508, 8.6387 Via E. D'Arborea, 129A - 09070 Siamaggiore OR P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	15/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 15/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 16/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del direttore dei lavori: 1) nel cantiere di Tramatzza l'impresa Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl hanno inserito nel sistema di avanzamento il tubo-camicia DN 2400 mm n. 14, quindi con n. 13 tubi oltre la cellula, infissi nel terreno al di sotto del Rio mare 'e foghe; 2) nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde di un tratto di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura, con il getto di calcestruzzo per la riconfigurazione del fondo dello stesso canale.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	16/01/2025  16 gen 2025, 12:26:05 46° NE Sardegna, Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 16/01/2025  16 gen 2025, 12:26:22 21° N Sardegna, Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	16/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B camera spinta microtunneling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 16/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B camera spinta microtunneling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 16/01/2025 P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione Canale Adduttore DX by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

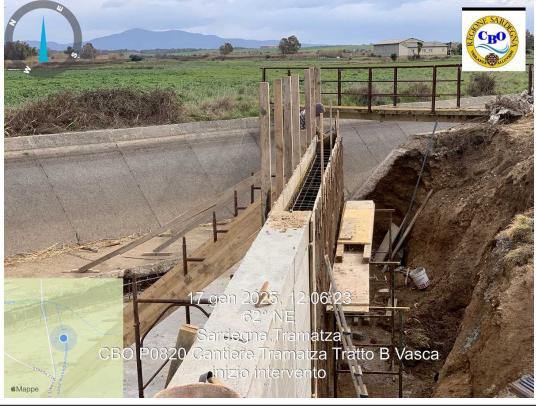
DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	16/01/2025 <i>P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione Canale Adduttore DX by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 16/01/2025 <i>P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione Canale Adduttore DX by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 16/01/2025 <i>P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione Canale Adduttore DX by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	16/01/2025  16 gen 2025, 11:49:46 279° W Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore <i>P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione Canale Adduttore DX by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 16/01/2025  16 gen 2025, 11:51:48 3° N Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore <i>P0820 Cantiere Siamaggiore Impermeabilizzazione Canale Adduttore DX by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>
17/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel cantiere di Tramatzà l'attività delle imprese CE.SI., Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogrù e trasporti srl prosegue anche oggi con l'avanzamento del sistema del microtunnelling, nel Tratto B, completando quasi l'infissione nel terreno di un altro tubo-camicia DN 2400 mm e portando quindi a n. 14 i tubi nell'attraversamento sotterraneo del rio Mare 'e foghe, oltre la cellula. Nella vasca di inizio intervento del Tratto B si sta completando l'armatura dei muri di collegamento vasca-canale per poter effettuare il getto di calcestruzzo a inizio della nuova settimana; nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde di un tratto di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura (tra Via E. D'Arborea e via A. Moro), con una parte dello stesso in cui è già stato effettuato il getto di calcestruzzo per la riconfigurazione del fondo oltre alla predisposizione del tubo per la valvola di sottopressione e un'altra parte in cui si stende il tessuto non tessuto e al di sopra lo strato di impermeabilizzazione costituito da geomembrana HDPE.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/01/2025  17 gen 2025, 14:53:25 316° NW Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B camera spinta microtunnelling 17/01/2025  17 gen 2025, 11:54:45 297° NW Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B camera spinta microtunnelling P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/01/2025 17 gen 2025, 11:56:02 52° NE Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B camera spinta microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 17/01/2025 17 gen 2025, 11:51:10 14° N Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B camera spinta microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 17/01/2025 17 gen 2025, 12:05:11 43° NE Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca inizio intervento <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/01/2025  17 gen 2025, 12:06:18 37° NE Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca inizio intervento <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 17/01/2025  17 gen 2025, 12:06:09 61° NE Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca inizio intervento <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 17/01/2025  17 gen 2025, 12:06:23 62° NE Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca inizio intervento <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/01/2025 17 gen 2025, 12:04:28 49° NE Sardegna, Tramatzà CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca inizio intervento P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/01/2025 17 gen 2025, 12:06:32 52° NE Sardegna, Tramatzà CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca inizio intervento P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/01/2025 17 gen 2025, 12:25:42 27° NE Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via Aldo Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea - Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/01/2025 17 gen 2025, 12:25:59 42° NE Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via Aldo Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea - Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/01/2025 17 gen 2025, 12:28:09 345° N Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via Aldo Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea - Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/01/2025 17 gen 2025, 12:30:39 272° W Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via Aldo Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea - Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/01/2025 17 gen 2025, 12:31:25 273° W Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via Aldo Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea - Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/01/2025 17 gen 2025, 12:32:24 272° W Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via Aldo Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea - Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 20/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzza nessuna attività per le imprese Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl, mentre la CE.SI. nella vasca di inizio intervento del Tratto B ha fatto eseguire il getto di calcestruzzo dei muri di collegamento vasca - canale; nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. (non ha operato la ditta G&G impermeabilizzazioni srl a causa delle piogge di questi giorni) prosegue l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde del tratto di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura (tra Via E. D'Arborea e via A. Moro) con la sistemazione del tessuto non tessuto (TNT). 20/01/2025 20 gen 2025, 12:55:44 32° NE Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B vasca inizio intervento P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	20/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia - Tratto B Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 20/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia - Tratto B Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 20/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzia - Tratto B Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	21/01/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 21/01/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 21/01/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	21/01/2025 21 gen 2025, 12:58:30 26° NE Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B. Vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 21/01/2025 21 gen 2025, 12:35:49 13° N Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto - Via E. Arborea /Via Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 21/01/2025 21 gen 2025, 12:34:34 7° N Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto - Via E. Arborea /Via Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	21/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto via E. d'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 22/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del Direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzia ancora ripreso l'attività le imprese Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl, con il riavvio del cantiere dopo alcuni giorni di pausa, mentre la CE.SI. nella vasca di fine intervento del Tratto B ha quasi terminato le operazioni di armatura della platea del fondo vasca per il getto di calcestruzzo che effettuerà domani mattina; nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl prosegue i lavori di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde del primo tratto di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura (tra Via E. D'Arborea e via A. Moro), in particolare con la sistemazione dell'impermeabilizzante in HDPE e con il getto di calcestruzzo sul fondo canale di un'altra parte di questo tratto. Questa mattina è stato avviato anche il cantiere di Zerfaliu per la rimozione della copertura del canale e successiva impermeabilizzazione dello stesso. 22/01/2025  P0820 Cantiere Tramatzia - Tratto B Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	22/01/2025  22 gen 2025, 12:53:41 323° NW Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 22/01/2025  22 gen 2025, 12:54:31 16° N Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 22/01/2025  22 gen 2025, 12:51:10 24° NE Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore, Tratto Via E Arborea- Via Moro P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto Via E. D'Arborea-Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	22/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto Via E. D'Arborea-Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 22/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto Via E. D'Arborea-Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO T A Z I O N I G E N E R A L I E S P E C I A L I SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	22/01/2025 P0820 Cantiere Zerfaliu - Canale adduttore dx Tirso - Tratto tombato by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .
23/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	23/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 23/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	23/01/2025 23 gen 2025, 10:50:42 340° N Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca fine intervento

P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

23/01/2025

23 gen 2025, 10:53:31

195° S

Sardegna, Tramatzza

CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B

Camera microtunnelling

P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	23/01/2025  23 gen 2025, 10:53:36 160° S Sardegna, Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B Camera microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 23/01/2025  23 gen 2025, 10:53:47 134° SE Sardegna, Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B Camera microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>
24/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzu prosegue lentamente l'attività delle imprese Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl, a causa di un nuovo problema tecnico in fase di risoluzione, mentre la CE.SI. nella vasca di inizio intervento del Tratto B rimuove i casseri dopo il getto di calcestruzzo della platea del fondo vasca, predisponendo anche l'armatura del cordolo di collegamento vasca-canale; nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl avanzano con i lavori di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde del primo tratto di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura (tra Via E. D'Arborea e via A. Moro), in particolare avanzando verso la fine del tratto con la sistemazione dell'impermeabilizzante in HDPE e con la sistemazione di un'altra valvola di sottopressione nel fondo canale. Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. hanno già demolito una parte della copertura del canale provvedendo a predisporre anche la recinzione sul lato prospiciente le abitazioni private.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/01/2025  24 gen 2025, 11:33:40 305° NW Sardegna, Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Camera microtunnelling P0820 Cantiere Tramatza - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/01/2025  24 gen 2025, 11:34:04 43° NE Sardegna, Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Camera microtunnelling P0820 Cantiere Tramatza - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/01/2025  24 gen 2025, 11:34:23 47° NE Sardegna,Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Camera microtunnelling P0820 Cantiere Tramatza - Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

24/01/2025



24 gen 2025, 11:37:25

34° NE

Sardegna,Tramatza

CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B vasca

inizio intervento

P0820 Cantiere Tramatza - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/01/2025 24 gen 2025, 11:37:52 41° NE Sardegna, Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B vasca inizio intervento P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	24/01/2025 24 gen 2025, 11:38:14 34° NE Sardegna, Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B vasca inizio intervento P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	24/01/2025 24 gen 2025, 11:38:48 35° NE Sardegna, Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B vasca inizio intervento P0820 Cantiere Tramatzu - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO	
	24/01/2025 P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	24/01/2025 P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto Via E. D'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	24/01/2025 P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto Via E. D'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/01/2025 24/01/2025 24/01/2025

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/01/2025  24 gen 2025, 11:54:03 287° W Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO-P0820 Cantiere Siamaggiore, Tratto Via E. Arborea/via Moril P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto Via E. D'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/01/2025  24 gen 2025, 11:55:15 92° E Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO-P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via E. Arborea/via Moril P0820 Cantiere Siamaggiore - Tratto Via E. D'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

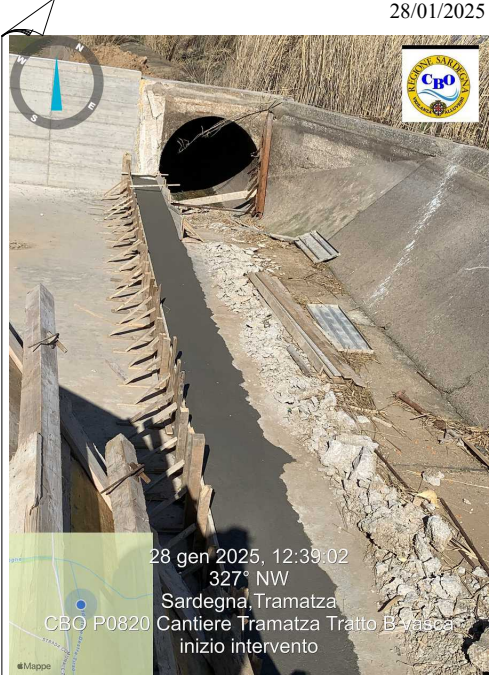
DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/01/2025 24 gen 2025, 12:15:13 17° N Sardegna, Zerfaliu, Via Nuova CBO P0820 Cantiere Zerfaliu P0820 Cantiere Zerfaliu - Tratto canale add. dx Tirso tombato by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/01/2025 24 gen 2025, 12:15:20 23° NE Sardegna, Zerfaliu, Via Nuova CBO P0820 Cantiere Zerfaliu P0820 Cantiere Zerfaliu - Tratto canale add. dx Tirso tombato by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/01/2025 24 gen 2025, 12:15:54 12° N Sardegna, Zerfaliu, Via Nuova CBO P0820 Cantiere Zerfaliu P0820 Cantiere Zerfaliu - Tratto canale add. dx Tirso tombato by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/01/2025  P0820 Cantiere Zerfaliu - Tratto canale add. dx Tirso tombato by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 24/01/2025  P0820 Cantiere Zerfaliu - Tratto canale add. dx Tirso tombato by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 27/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del Direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzia prosegue ancora a rilento l'attività delle imprese Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl, sempre a causa di un problema tecnico del sistema di movimento del carrello trasportatore per il carico e scarico della terra scavata, questa sera è in fase di ultimazione l'infissione del tubo-camicia n. 14; la CE.SI. nelle vasche di inizio intervento del Tratto A e del Tratto B ha predisposto armatura e casseri per il getto di calcestruzzo del cordolo di collegamento vasca-canale che sarà effettuato domani; nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl proseguono con i lavori di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde del primo tratto di canale adduttore oggetto di rimozione della copertura (tra Via E. D'Arborea e via A. Moro), avviandosi verso la fine dello stesso tratto: è stata cementata un'altra parte di canale, avanzando ulteriormente con l'impermeabilizzazione e nei prossimi due giorni dovrebbe essere completato. Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. stanno rimuovendo il materiale prodotto con la demolizione della copertura della prima parte di canale e trasportandolo in discarica autorizzata e hanno provveduto a sistemare altre reti di recinzione sul lato prospiciente le abitazioni private.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	27/01/2025  27 gen 2025, 15:51:53 326° NW Sardegna, Tramatzà CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Camera spinta microtunnelling P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 27/01/2025  27 gen 2025, 15:53:22 17° N Sardegna, Tramatzà CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Camera spinta microtunnelling P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	27/01/2025 P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 27/01/2025 P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

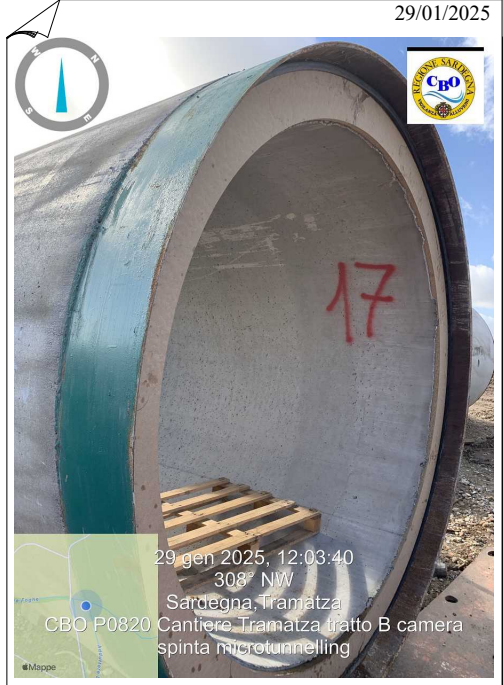
DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
28/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	27/01/2025  27 gen 2025, 16:01:56 42° NE Sardegna San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B Vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B Vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 28/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 28/01/2025  28 gen 2025, 12:20:46 17° N Sardegna, Tramatzu, Strada Comunale Zeddiani Tramatzu CBO P0820 Cantiere Tramatzu Tratto A Vasca inizio intervento P0820 Cantiere Tramatzu Tratto A vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	28/01/2025  P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 28/01/2025  P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 28/01/2025  P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	28/01/2025 28 gen 2025, 12:39:11 18° N Sardegna, Tramatzia CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca inizio intervento P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 28/01/2025 28 gen 2025, 12:45:12 15° N Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 28/01/2025 28 gen 2025, 12:45:38 11° N Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	28/01/2025    28 gen 2025, 12:29:18 326° NW Sardegna,Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 28/01/2025    28 gen 2025, 12:28:55 18° N Sardegna,Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl, con l'ultimazione dell'infissione del tubo-camicia DN 2400 mm n. 15 e la discesa di quello n. 17; la CE.SI. sta ultimando l'armatura dei muri della vasca di fine intervento del Tratto B; nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl hanno praticamente impermeabilizzato il tratto di canale tra Via E. d'Arborea e Via Moro con la sistemazione del manto HDPE e la cementazione del fondo dell'ultima parte dello stesso tratto. Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. continuano la demolizione della copertura del canale tombato e trasportandolo lo stesso in discarica autorizzata. 29/01/2025  29 gen 2025, 12:03:27 337° NW Sardegna,Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza tratto B camera spinta microtunnelling P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 29/01/2025  29 gen 2025, 12:03:47 17° N Sardegna,Tramatza CBO P0820 Cantiere Tramatza tratto B camera spinta microtunnelling P0820 Cantiere Tramatza Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	29/01/2025  29 gen 2025, 12:04:04 20° N Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza tratto B camera spinta microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>
	29/01/2025  29 gen 2025, 12:03:40 308° NW Sardegna, Tramatzza CBO P0820 Cantiere Tramatzza tratto B camera spinta microtunnelling <i>P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	29/01/2025 29 gen 2025, 12:18:07 18° N Sardegna Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore tratto Via Moro <i>P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via E. d'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 29/01/2025 29 gen 2025, 12:19:04 30° NE Sardegna Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore tratto Via Moro <i>P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via E. d'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 29/01/2025 29 gen 2025, 12:19:30 311° NW Sardegna, Siamaggiore, Via Aldo Moro CBO P0820 Cantiere Siamaggiore tratto Via Moro <i>P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via E. d'Arborea/Via Moro by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	29/01/2025 29 gen 2025, 12:31:12 10° N Sardegna, Zerfaliu, SP 9 CBO P0820 Cantiere Zerfaliu P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 29/01/2025 29 gen 2025, 12:31:51 5° N Sardegna, Zerfaliu, Via Nuova CBO P0820 Cantiere Zerfaliu P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 29/01/2025 29 gen 2025, 12:32:43 36° NE Sardegna, Zerfaliu, Via Nuova CBO P0820 Cantiere Zerfaliu P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	29/01/2025 29 gen 2025, 12:34:17 15° N Sardegna, Zerfaliu, Via Nuova CBO P0820 Cantiere Zerfaliu P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 29/01/2025 29 gen 2025, 12:33:07 8° N Sardegna, Zerfaliu, Via Nuova CBO P0820 Cantiere Zerfaliu P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
30/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel cantiere di Tramatzu avanza l'attività del microtunnelling a cura delle imprese CE.SI., Tecnoattraversamenti Srl e Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl, con l'infissione dei altri tubi-camicia DN 2400 mm n. 15 e la CE.SI. ha ultimato l'armatura di uno dei due muri della vasca di fine intervento del Tratto B e tra domani e lunedì completerà anche quella dell'altro muro per procedere successivamente al getto di calcestruzzo; nel cantiere di Siamaggiore la CE.SI. e la ditta G&G impermeabilizzazioni srl hanno terminato l'impermeabilizzazione del primo tratto di canale tra Via E. d'Arborea e Via Moro con la sistemazione del manto HDPE e la cementazione del fondo dell'ultima parte dello stesso tratto. Nel cantiere di Zerfaliu gli operai della CE.SI. hanno ultimato la demolizione della copertura del canale tombato e con gli autocarri effettuano il trasporto dei materiali in discarica autorizzata.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	30/01/2025 30 gen 2025, 13:00:20 27° NE Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 30/01/2025 30 gen 2025, 13:00:50 30° NE Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 30/01/2025 30 gen 2025, 13:01:01 37° NE Sardegna, San Vero Milis CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca fine intervento P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	30/01/2025 P0820 Cantiere Siamaggiore Primo Tratto (via Moro) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 30/01/2025 P0820 Cantiere Siamaggiore Primo Tratto (via Moro) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 30/01/2025 P0820 Cantiere Siamaggiore Primo Tratto (via Moro) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	30/01/2025 P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 30/01/2025 P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	30/01/2025  30 gen 2025, 12:05:55 43° N Sardegna, Zerfaliu, SP 9 CBO P0820 Cantiere Zerfaliu <i>P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 30/01/2025  30 gen 2025, 12:05:16 34° N Sardegna, Zerfaliu, SP 9 CBO P0820 Cantiere Zerfaliu <i>P0820 Cantiere Zerfaliu by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>
31/01/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori nel cantiere di Siamaggiore dove sono iniziati i lavori di impermeabilizzazione del secondo tratto (nei pressi di via E. d'Arborea) con la posa del TNT e del manto HDPE dei primi 50 metri circa. Il sopralluogo di è reso anche necessario in quanto su segnalazione dell'impresa CE.SI. la prima parte di questo tratto è interessata da uno scarico fognario proveniente da una abitazione privata che non consentirebbe la realizzazione dell'impermeabilizzazione. Il DL a tal proposito si è recato presso gli Uffici del Comune di Siamaggiore segnalando quanto accertato presso il secondo tratto del canale adduttore destra Tirso al Sindaco e al Responsabile del Servizio Tecnico e chiedendo un tempestivo intervento pe consentire la prosecuzione dei lavori.

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	31/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Secondo Tratto (pressi Via E. d'Arborea) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 31/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Secondo Tratto (pressi Via E. d'Arborea) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 31/01/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore - Secondo Tratto (pressi Via E. d'Arborea) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	31/01/2025  31 gen 2025, 11:44:21 38° NE Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore 2 Tratto P0820 Cantiere Siamaggiore - Secondo Tratto (pressi Via E. d'Arborea) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
