

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI G E N E R A L I E S P E C I A L I SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
04/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 06/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Sopralluogo del Direttore dei Lavori: nel cantiere di Tramatzu la CE.SI. e la ditta Tecnoattraversamenti srl proseguono a rilento questa mattina le attività nella camera di spinta del microtunnelling (tratto B) a causa di un problema al sistema di pompaggio dell'acqua e, pertanto, oltre il rostro iniziale sono stati infissi nel tratto del Rio Mare 'e foghe completamente n. 23 tubi DE 2500 mm, il n. 24 è in fase di infissione (circa 50%) con il n. 25 posizionato nel sistema di perforazione. Una squadra di operai della CE.SI. ha iniziato a disarmare il muro di chiusura della vasca di fine intervento del Tratto A, il cui getto è stato effettuato ieri, unitamente ai muri delle vasche di inizio intervento del tratto B e della vasca di inizio intervento del tratto A, e successivamente la stessa operazione verrà effettuata nelle altre vasche. Nella vasca di fine intervento del tratto B è stata completata anche la pulizia e il riordino, oltre che all'impermeabilizzazione con specifica malta, e le stesse lavorazioni saranno effettuate anche nelle altre tre vasche. Nel cantiere di Siamaggiore (tratto Via Roma -Via S. Pietro) oltre a qualche rifinitura relativa all'impermeabilizzazione, è necessario provvedere alla pulizia e al riordino del canale, in vista del probabile avvio dell'erogazione idrica di soccorso all'inizio della prossima settimana. Nel cantiere di Solarussa (tratto Via Tempio -Via Oristano) le due squadre specializzate e la CE.SI. proseguono le attività di impermeabilizzazione del canale anche con la cementazione del fondo, entro questa settimana (compreso sabato) dovrebbe essere completata questa attività, così come pulizia e il riordino del canale, in vista del probabile avvio dell'erogazione idrica di soccorso.



P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .



P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B camera spinta microtunnelling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	06/03/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 06/03/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 06/03/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzia Tratto A vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	06/03/2025 <i>P0820 Cantiere Solarussa Tratto pressi Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 06/03/2025 <i>P0820 Cantiere Solarussa Tratto pressi Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 06/03/2025 <i>P0820 Cantiere Solarussa Tratto ponticello Via Oristano/ Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	06/03/2025 6 mar 2025, 11:01:46 41° N Sardegna, Solarussa, Via Oristano OBO P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Tempio P0820 Cantiere Solarussa Tratto ponticello Via Oristano/Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 06/03/2025 6 mar 2025, 11:10:36 41° N Sardegna, Solarussa, Via Oristano OBO P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Oristano P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 06/03/2025 6 mar 2025, 11:12:41 38° NE Sardegna, Solarussa, Via Oristano OBO P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Oristano P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

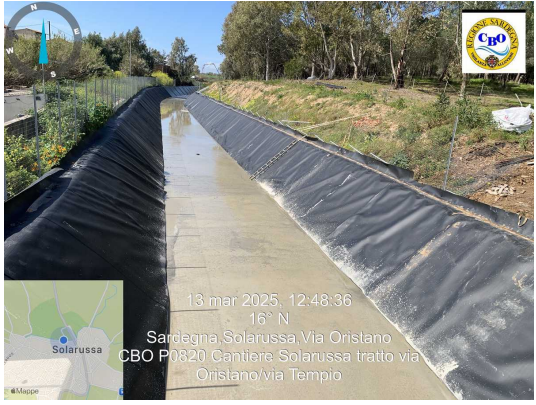
DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
07/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	06/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) Visita del direttore dei lavori: La CE.SI. unitamente alle imprese specializzate che operano per le attività di impermeabilizzazione dei canali, stanno ultimando nel cantiere di Solarussa tali lavorazioni nel tratto di canale adduttore destra Tirso tra Via Oristano e Via Tempio, sia con la sistemazione degli ultimi teli da 8 metri di HDPE, sia con il getto di calcestruzzo del fondo. Il lavoro dovrebbe completarsi entro domani o lunedì. 07/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio- Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 07/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio - Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	07/03/2025 7 mar 2025, 11:35:45 343° N Sardegna, Solarussa, Via della Repubblica CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Tempio P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio - Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 07/03/2025 7 mar 2025, 11:39:15 13° N Sardegna, Solarussa, Via Logudoro CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Oristano P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio - Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 07/03/2025 7 mar 2025, 11:40:26 35° NE Sardegna, Solarussa, Via della Repubblica CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Oristano P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio- Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
10/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	07/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio - Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) Nel cantiere di Tramatzza per un ulteriore problema al sistema del microtunnelling (nastro trasportatore da sostituire) questo tipo di lavorazione da parte della ditta Tecnoattraversamenti srl è sospesa e dovrebbe riprendere mercoledì, mentre al momento del sopralluogo si stava attivando il cantiere della CE.SI. per proseguire i lavori di impermeabilizzazione delle quattro vasche, oltre alla sistemazione e alla pulizia dei tratti interessati. Nel cantiere di Solarussa, invece, le due squadre specializzate e la CE.SI. stanno completando l'impermeabilizzazione del canale tra Via Tempio e Via Oristano con l'ultima parte da cementare e la sagomatura del telo in corrispondenza dei ponticelli. 10/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 10/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	10/03/2025 10 mar 2025, 12:43:15 40° NE Sardegna Solarussa Via Oristano CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Oristano <i>P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>
	10/03/2025 10 mar 2025, 12:43:26 41° N Sardegna Solarussa Via Oristano CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Oristano <i>P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>
	10/03/2025 10 mar 2025, 12:50:01 35° NE Sardegna Solarussa Via Oristano CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Oristano <i>P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
12/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	10/03/2025  P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) Visita del Direttore dei lavori nel cantiere di Solarussa dove nel tratto di Via Oristano (verso Via Tempio) risulta ancora da completare la cementazione del fondo del canale di un ultimo tratto di circa 50 metri verso il ponticello di Via Tempio. Non risulta presente alcun operaio, essendo una giornata particolarmente piovosa. 12/03/2025  P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Oristano (verso Via Tempio) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 12/03/2025  P0820 Cantiere Solarussa tratto Via Oristano (verso Via Tempio) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 13/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatzza dove l'attività del microtunnelling è ancora sospesa a seguito del malfunzionamento del sistema per la rottura del nastro. Anche per tale motivo si è svolto un sopralluogo con l'impresa CE.SI (Geom. Sabiu) e la Tecnoattraversamenti (Ing. Ferrazzuolo) per la verifica dello stato dei lavori e per concordare l'urgente ripresa degli stessi. Presumibilmente i lavori riprenderanno la prossima settimana, tra lunedì e martedì.

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	13/03/2025  13 mar 2025, 12:48:03 29° NE Sardegna Solarussa, Via Oristano CBO P0820 Cantiere Solarussa tratto via Oristano/via Tempio P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio/Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 13/03/2025  13 mar 2025, 12:48:36 16° N Sardegna Solarussa, Via Oristano CBO P0820 Cantiere Solarussa tratto via Oristano/via Tempio P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio/Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 13/03/2025  13 mar 2025, 12:51:20 8° N Sardegna Solarussa, Via Oristano CBO P0820 Cantiere Solarussa tratto via Oristano P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

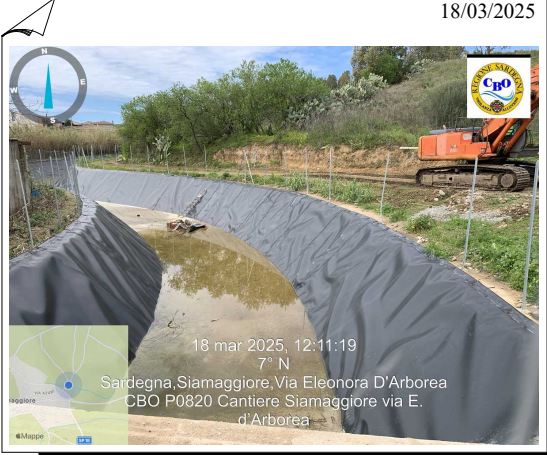
DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
14/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	13/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) Questa mattina è stato svolto un sopralluogo ricognitivo nei vari cantieri di Tramatzza, Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu con il Geom. Sabiu dell'impresa CE.SI. al fine di verificare se il canale adduttore destra Tirso fosse completamente sgombrato per poter avviare nei prossimi giorni l'invasamento in vista dell'imminente avvio della stagione irrigua. Il canale nei vari tratti interessati dai lavori di impermeabilizzazione e nel cantiere di Tramatzza risulta praticamente libero per essere invasato, a parte qualche tratto in fase di ultimazione nella pulizia e nella rimozione di materiale vario (tranne due ture rispettivamente nel tratto di Siamaggiore e Tramatzza che verranno rimosse lunedì in accordo con il Servizio Reti). 14/03/2025 P0820 Cantiere Tramatzza Canale adduttore destra Tirso (strada sterrata) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 14/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Via Tempio/Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	14/03/2025 14 mar 2025, 11:59:17 38° NE Sardegna, Solarussa, Via Logudoro CBO P0820 Cantiere Solarussa tratto via Oristano 14/03/2025 14 mar 2025, 12:12:45 9° N Sardegna, Zerfaliu, Via Nuova CBO P0820 Cantiere Zerfaliu 14/03/2025 14 mar 2025, 12:21:45 42° NE Sardegna, Siamaggiore, Via Eleonora D'Arborea CBO P0820 Cantiere Siamaggiore 17/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Solarussa per la verifica della pulizia e del riordino del canale adduttore destra Tirso in vista delle operazioni di invaso in apertura di stagione irrigua. Mentre nei tratti di canale presso Siamaggiore e Tramatzia permangono (in accordo con il Servizio Reti con il cui personale è stato effettuato il sopralluogo) delle ture per favorire l'accumulo di materiale trasportato dall'acqua che viene gradualmente invasata e che successivamente verrà rimosso dal personale operaio CBO, mentre in due zone del canale di Solarussa (una nel primo e una nel secondo tratto) sono presenti ancora dei cumuli di materiale che nel fine settimana scorso sarebbero dovuti essere rimossi dall'impresa esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione. Pertanto, sentito telefonicamente il capo cantiere della CE.SI., Geom. Sabiu, tale attività verrà svolta nell'arco di qualche ora per liberare il canale dal materiale terroso e residuale dei lavori del cantiere.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/03/2025  P0820 Cantiere Solarussa Via Deledda/Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/03/2025  P0820 Cantiere Solarussa Via Deledda/Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/03/2025  P0820 Cantiere Solarussa Via Deledda/Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
18/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel cantiere di Solarussa il canale adduttore destra Tirso è stato ripulito dall'impresa CE.SI. nei tratti indicati ieri e documentati nel giornale dei lavori(Via Tempio e Via Tharros), mentre la tura del canale di Siamaggiore (Via E. d'Arborea) permane in attesa dell'accumulo di altro materiale trasportato dall'acqua, per poi essere rimosso completamente prima dell'avvio delle operazioni di invaso. Gli operai dell'impresa esecutrice, in attesa delle attività di invaso del canale, procedono con il fissaggio del telo di HDPE nei bordi alti del canale.

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	18/03/2025 18 mar 2025, 11:46:09 135° SE Sardegna, Solarussa, Via Tempio CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Tempio <i>P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 18/03/2025 18 mar 2025, 11:46:14 137° SE Sardegna, Solarussa, Via Tempio CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Tempio <i>P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 18/03/2025 18 mar 2025, 11:46:39 152° SE Sardegna, Solarussa, Via Tempio CBO P0820 Cantiere Solarussa Via Tempio <i>P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tempio by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	18/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 18/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Oristano by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 18/03/2025 P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tharros by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO		
	18/03/2025  P0820 Cantiere Solarussa Tratto Via Tharros by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 18/03/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via E. d'Arborea by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 18/03/2025  P0820 Cantiere Siamaggiore Tratto Via E. d'Arborea by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) <tr><td>19/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI</td><td>Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatzà dove da ieri sono riprese le attività del microtunnelling (Tratto B) con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, e la Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl. Sono stati scaricati 2 carrelli di terreno, per cui l'avanzamento nell'infissione è minimo rispetto a quando è stata interrotta la lavorazione, circa 10 giorni fa, con il tubo-camicia DN 2500 mm n. 24 in fase di infissione e quello n. 25 a seguire già predisposto nella camera di spinta.</td></tr>	19/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatzà dove da ieri sono riprese le attività del microtunnelling (Tratto B) con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, e la Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl. Sono stati scaricati 2 carrelli di terreno, per cui l'avanzamento nell'infissione è minimo rispetto a quando è stata interrotta la lavorazione, circa 10 giorni fa, con il tubo-camicia DN 2500 mm n. 24 in fase di infissione e quello n. 25 a seguire già predisposto nella camera di spinta.
19/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatzà dove da ieri sono riprese le attività del microtunnelling (Tratto B) con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, e la Agueci Francesco noleggio autogru e trasporti srl. Sono stati scaricati 2 carrelli di terreno, per cui l'avanzamento nell'infissione è minimo rispetto a quando è stata interrotta la lavorazione, circa 10 giorni fa, con il tubo-camicia DN 2500 mm n. 24 in fase di infissione e quello n. 25 a seguire già predisposto nella camera di spinta.		

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	21/03/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B camera spinta microtunneling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 21/03/2025 <i>P0820 Cantiere Tramatzu Tratto B camera spinta microtunneling by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 25/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatzu dove i lavori del microtunneling (Tratto B), con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, sino a martedì sono rimasti bloccati a causa dell'impossibilità di proseguire con l'infissione dei tubi con il sistema idraulico in quanto a monte dei tubi-camicia già interrati (rostro) il terreno impastato di acqua ha creato una barriera che non consente la prosecuzione dei lavori con la metodologia sinora utilizzata. Pertanto, da questa mattina l'impresa Tecnoattraversamenti Srl sta predisponendo il terreno dalla parte opposta al sistema di infissione (camera di arrivo) per scavare sino alla profondità di posa dei tubi-camicia, intercettando il rostro e poter così riprendere l'infissione dalla camera di spinta sino al raggiungimento della camera di arrivo (scavando e infiggendo con il sistema idraulico) e concludere così questo tratto di attraversamento del rio mare 'e foghe.

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	25/03/2025  <i>P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B (pressi camera di arrivo) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 25/03/2025  <i>P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B (pressi camera di arrivo) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 25/03/2025  <i>P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B (pressi camera di arrivo) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 26/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatzza dove i lavori del microtunnelling (Tratto B), con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, sino a martedì sono rimasti bloccati a causa dell'impossibilità di proseguire con l'infissione dei tubi con il sistema idraulico in quanto a monte dei tubi-camicia già interrati (rostro) il terreno impastato di acqua ha creato una barriera che non consente la prosecuzione dei lavori con la metodologia sinora utilizzata. Pertanto, da questa mattina l'impresa Tecnoattraversamenti Srl sta predisponendo il terreno dalla parte opposta al sistema di infissione (camera di arrivo) per scavare sino alla profondità di posa dei tubi-camicia, intercettando il rostro e poter così riprendere l'infissione dalla camera di spinta sino al raggiungimento della camera di arrivo (scavando e infiggendo con il sistema idraulico) e concludere così questo tratto di attraversamento del rio mare 'e foghe. 28/03/2025 Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatzza dove i lavori del microtunnelling (Tratto B), con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl,

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	continua lo scavo del terreno dalla parte opposta al sistema di infissione (camera di arrivo, in destra del rio Mare 'e foghe) sino alla profondità di posa delle tubazioni, collocando il tubo-camicia n. 26 in continuità con quello intercettato e infisso dalla camera di spinta. I lavori proseguiranno in questo modo sino alla camera di arrivo. 28/03/2025  P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B (pressi camera arrivo) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 28/03/2025  P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B (pressi camera arrivo) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 28/03/2025  P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B (pressi camera arrivo) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	28/03/2025 P0820 Cantiere Tramatza Tratto B (pressi camera arrivo) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 28/03/2025 P0820 Cantiere Tramatza Tratto B (pressi camera arrivo) by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 31/03/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del direttore dei lavori nel cantiere di Tramatza dove proseguono i lavori del microtunnelling (Tratto B), con l'impresa Tecnoattraversamenti Srl, che dalla parte opposta al sistema di infissione (camera di arrivo, in destra del rio Mare 'e foghe) sta terminando la posa delle tubazioni, collocando il tubo-camicia n. 31(su 33) in prossimità ormai della camera di arrivo. Presente in cantiere l'Archeologa Sanna. 31/03/2025 P0820 Cantiere Tramatza Tratto B - camera arrivo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	31/03/2025 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B - camera arrivo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 31/03/2025 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B - camera arrivo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 31/03/2025 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B - camera arrivo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
