REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Oristano

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Via Cagliari n. 170 - Oristano

UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO

PROGETTO ESECUTIVO

CUP G14H15001150002 - CAT. P0516

PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
"Eliminazione interferenze delle infrastrutture irrigue
consortili con gli argini del fiume Tirso."

CRONOPROGRAMMA DI SPESA E TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

All. C /14

n° prog.

Il progettista
Dott. Ing. Roberto Sanna

V.il Resp. del procedimento
Dott. Ing. Massimo Sanna

Data

Data appr.

N. ord	OPERE	LAVORI
1	Attraversamento Sa Mestia	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
2	Attraversamento Fainxeddas n. 1	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
3	Attraversamento Fainxeddas n. 2	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
4	Attraversamento Fainxeddas n. 3	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
5	Attraversamento Fraidis	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
6	Attraversamento Torangius	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
7	Attraversamento Bennaxi n. 1	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
8	Attraversamento Bennaxi n. 2	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
9	Attraversamento Su Pardu	Impianto Cantiere
		Ordinativi e accantieramento materiali
		Scavi, smontaggi e demolizioni
		Posa tubazioni e pezzi speciali
		Getti in calcestruzzo
		Ricostituzione corpo arginale
		Ripristino dei luoghi
		ripristino dei luoghi
		Smobilizzo cantiere

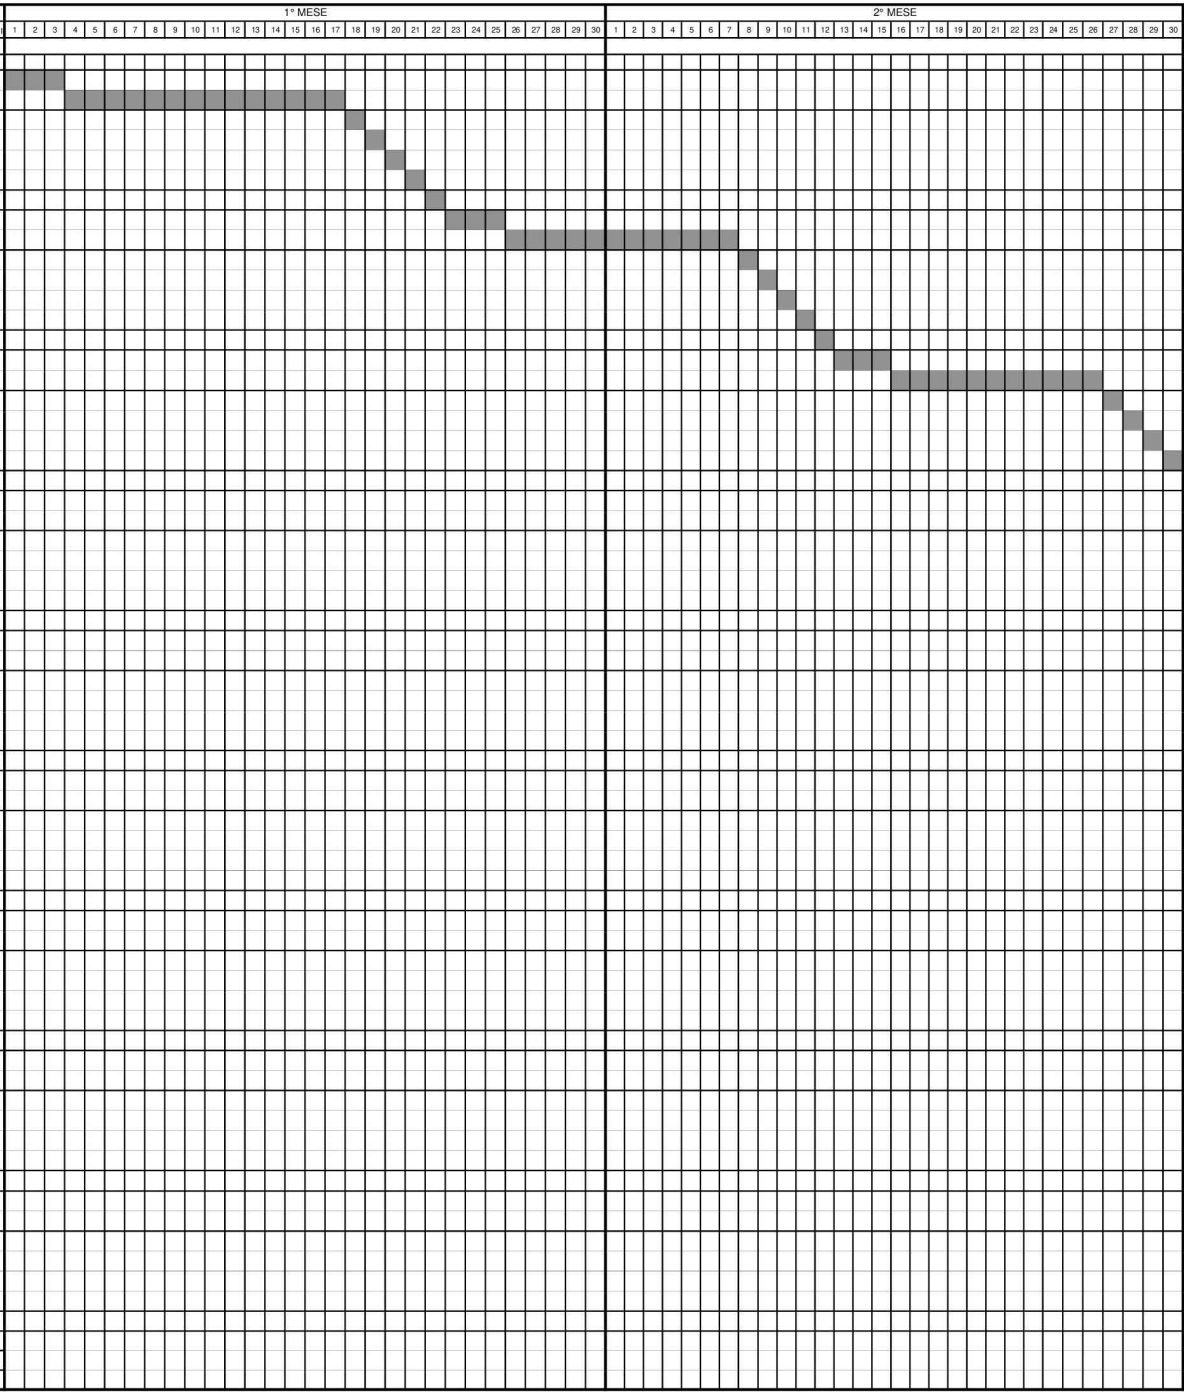

Impianto Cantiere		3498	5198
Scavi, smontaggi e demolizioni		17500	12500
Posa tubazioni e pezzi speciali		23235	35500
Getti in calcestruzzo		1189	35020
Ripristino dei luoghi		12500	12800
ripristino dei luoghi		6500	7000
Smobilizzo cantiere		4800	6000
		69222	114018

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

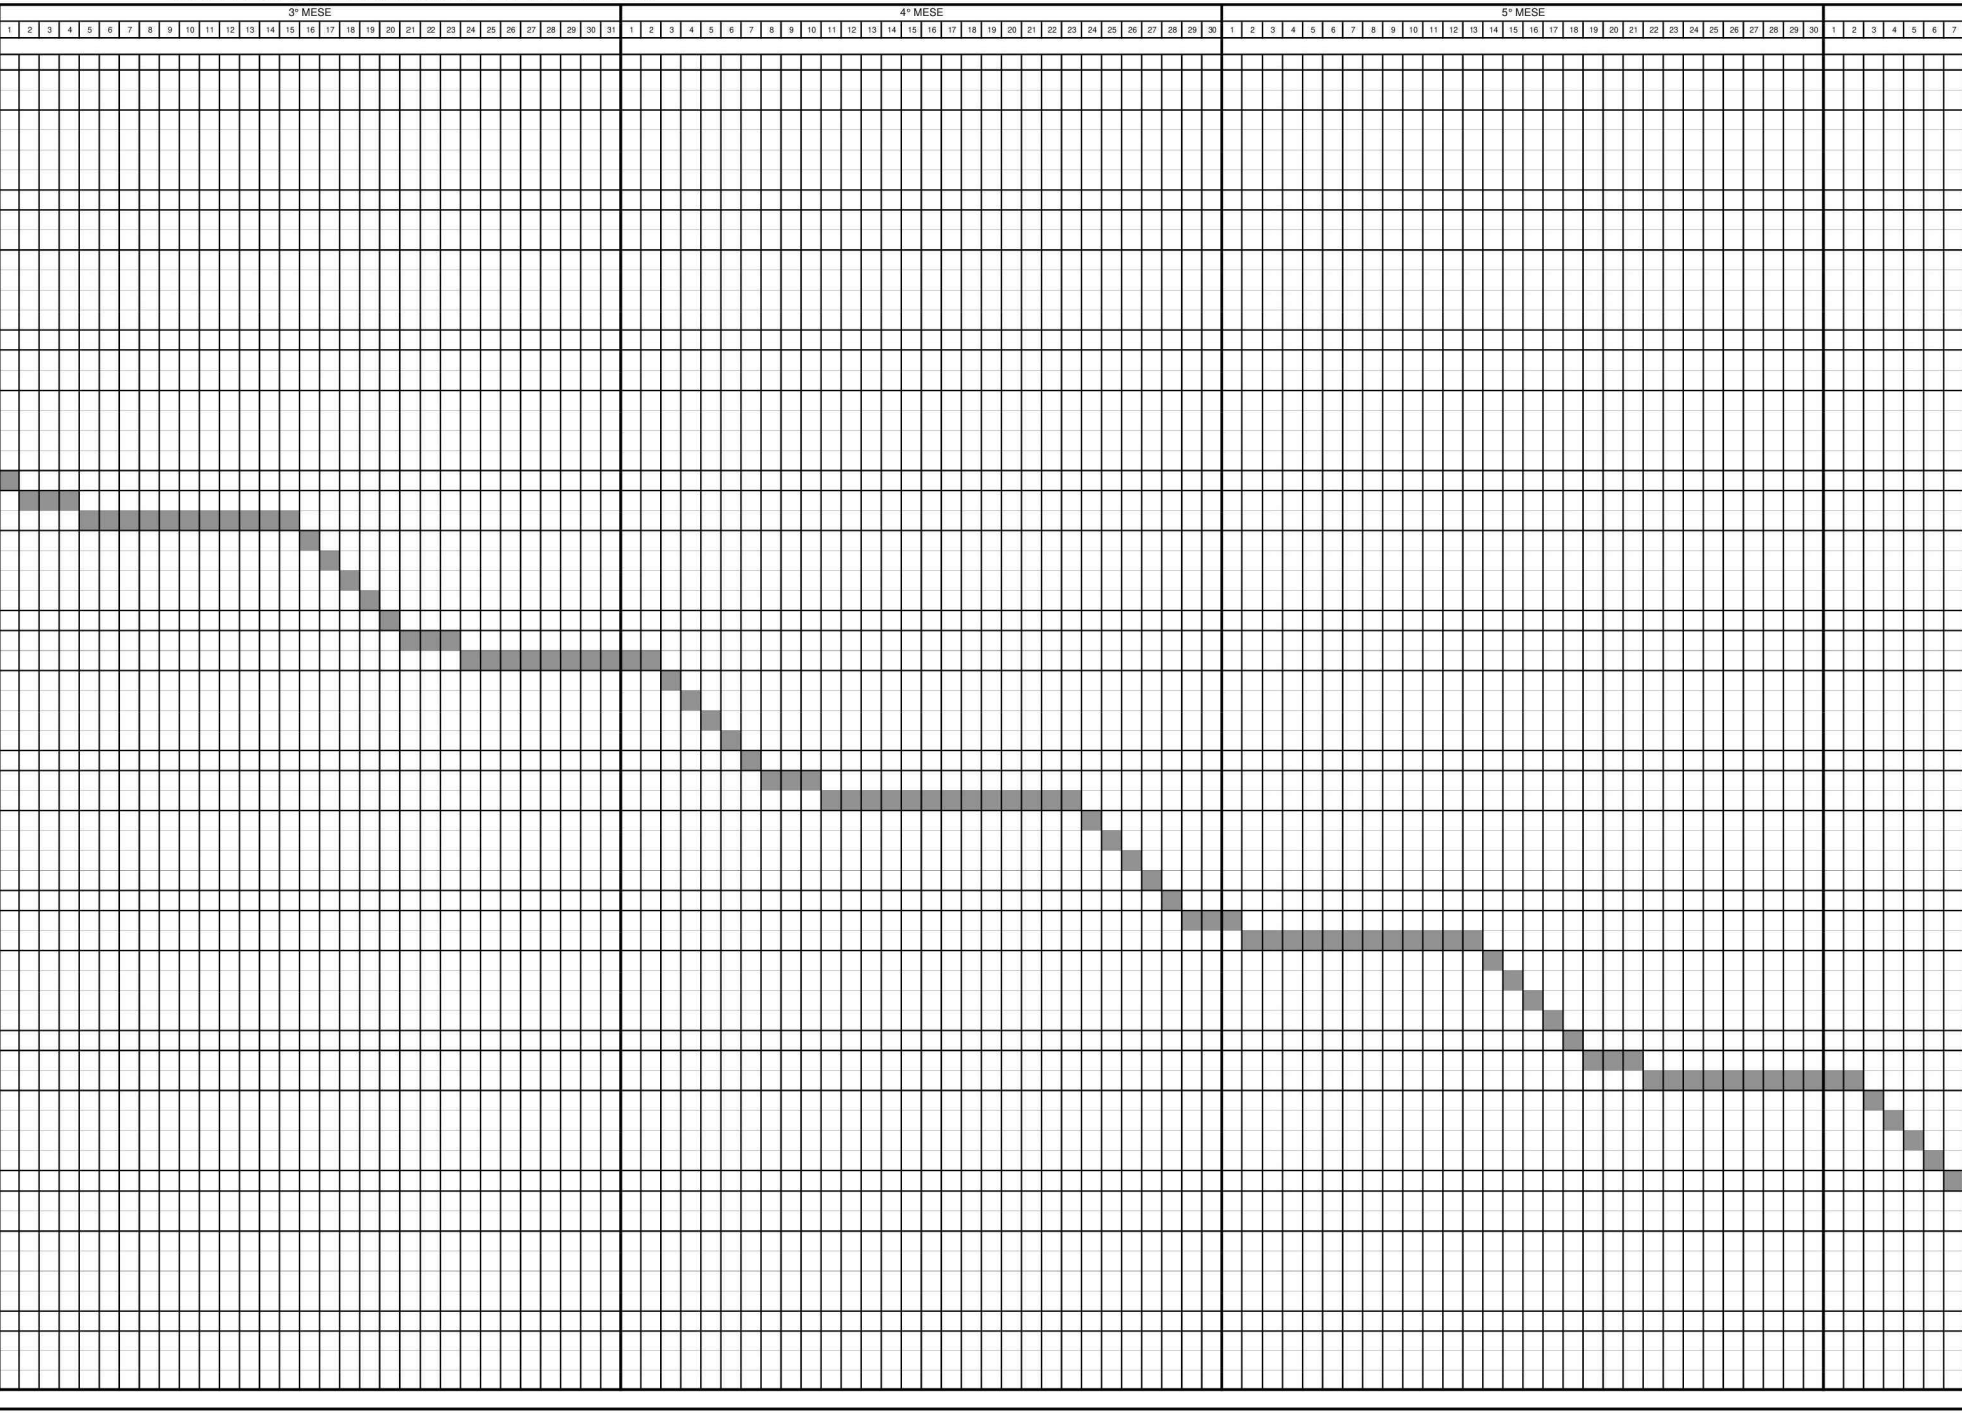

4698	5498	4900
23500	21300	19800
33500	23235	46800
3200	1189	4200
12800	11500	12500
6500	6500	6500
5800	5800	5500
89998	75022	100200



	TOTALE
5500	
29003	
39800	
1189	
12500	
6500	
5600	
100092	**548552**

			7° MESE																																			
		GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
N.	OPERE	LAVORI																																					
ord																																							
10	Attraversamento Pardu Nou	Impianto Cantiere	▨	▨	▨																																		
		Ordinativi e accantieramento materiali				▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨																				
		Scavi, smontaggi e demolizioni																		▨																			
		Posa tubazioni e pezzi speciali																			▨																		
		Getti in calcestruzzo																				▨																	
		Ricostituzione corpo arginale																					▨																
		Ripristino dei luoghi																						▨															
11	Attraversamento Bau Ampei n. 1	Impianto Cantiere																							▨	▨	▨												
		Ordinativi e accantieramento materiali																										▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
		Scavi, smontaggi e demolizioni																																					
		Posa tubazioni e pezzi speciali																																					
		Getti in calcestruzzo																																					
		Ricostituzione corpo arginale																																					
		Ripristino dei luoghi																																					
12	Attraversamento Bau Ampei n. 2	Impianto Cantiere																																					
		Ordinativi e accantieramento materiali																																					
		Scavi, smontaggi e demolizioni																																					
		Posa tubazioni e pezzi speciali																																					
		Getti in calcestruzzo																																					
		Ricostituzione corpo arginale																																					
		Ripristino dei luoghi																																					
13	Attraversamento Bau Ampei n. 3	Impianto Cantiere																																					
		Ordinativi e accantieramento materiali																																					
		Scavi, smontaggi e demolizioni																																					
		Posa tubazioni e pezzi speciali																																					
		Getti in calcestruzzo																																					
		Ricostituzione corpo arginale																																					
		Ripristino dei luoghi																																					
14	Attraversamento Bau Ampei n. 4	Impianto Cantiere																																					
		Ordinativi e accantieramento materiali																																					
		Scavi, smontaggi e demolizioni																																					
		Posa tubazioni e pezzi speciali																																					
		Getti in calcestruzzo																																					
		Ricostituzione corpo arginale																																					
		Ripristino dei luoghi																																					
15	Attraversamento Cuccuru Ruinas	Impianto Cantiere																																					
		Ordinativi e accantieramento materiali																																					
		Scavi, smontaggi e demolizioni																																					
		Posa tubazioni e pezzi speciali																																					
		Getti in calcestruzzo																																					
		Ricostituzione corpo arginale																																					
		Ripristino dei luoghi																																					
16	Attraversamento Barramau	Impianto Cantiere																																					
		Ordinativi e accantieramento materiali																																					
		Scavi, smontaggi e demolizioni																																					
		Posa tubazioni e pezzi speciali																																					
		Getti in calcestruzzo																																					
		Ricostituzione corpo arginale																																					
		Ripristino dei luoghi																																					
17	Attraversamento Mongias	Impianto Cantiere																																					
		Ordinativi e accantieramento materiali																																					
		Scavi, smontaggi e demolizioni																																					
		Posa tubazioni e pezzi speciali																																					
		Getti in calcestruzzo																																					
		Ricostituzione corpo arginale																																					
		Ripristino dei luoghi																																					
		ripristino dei luoghi																																					
		Smobilizzo cantiere																																					

Impianto Cantiere			4998
Scavi, smontaggi e demolizioni			23500
Posa tubazioni e pezzi speciali			23235
Getti in calcestruzzo			1189
Ripristino dei luoghi			12500
ripristino dei luoghi			6500
Smobilizzo cantiere			5800
			77722

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

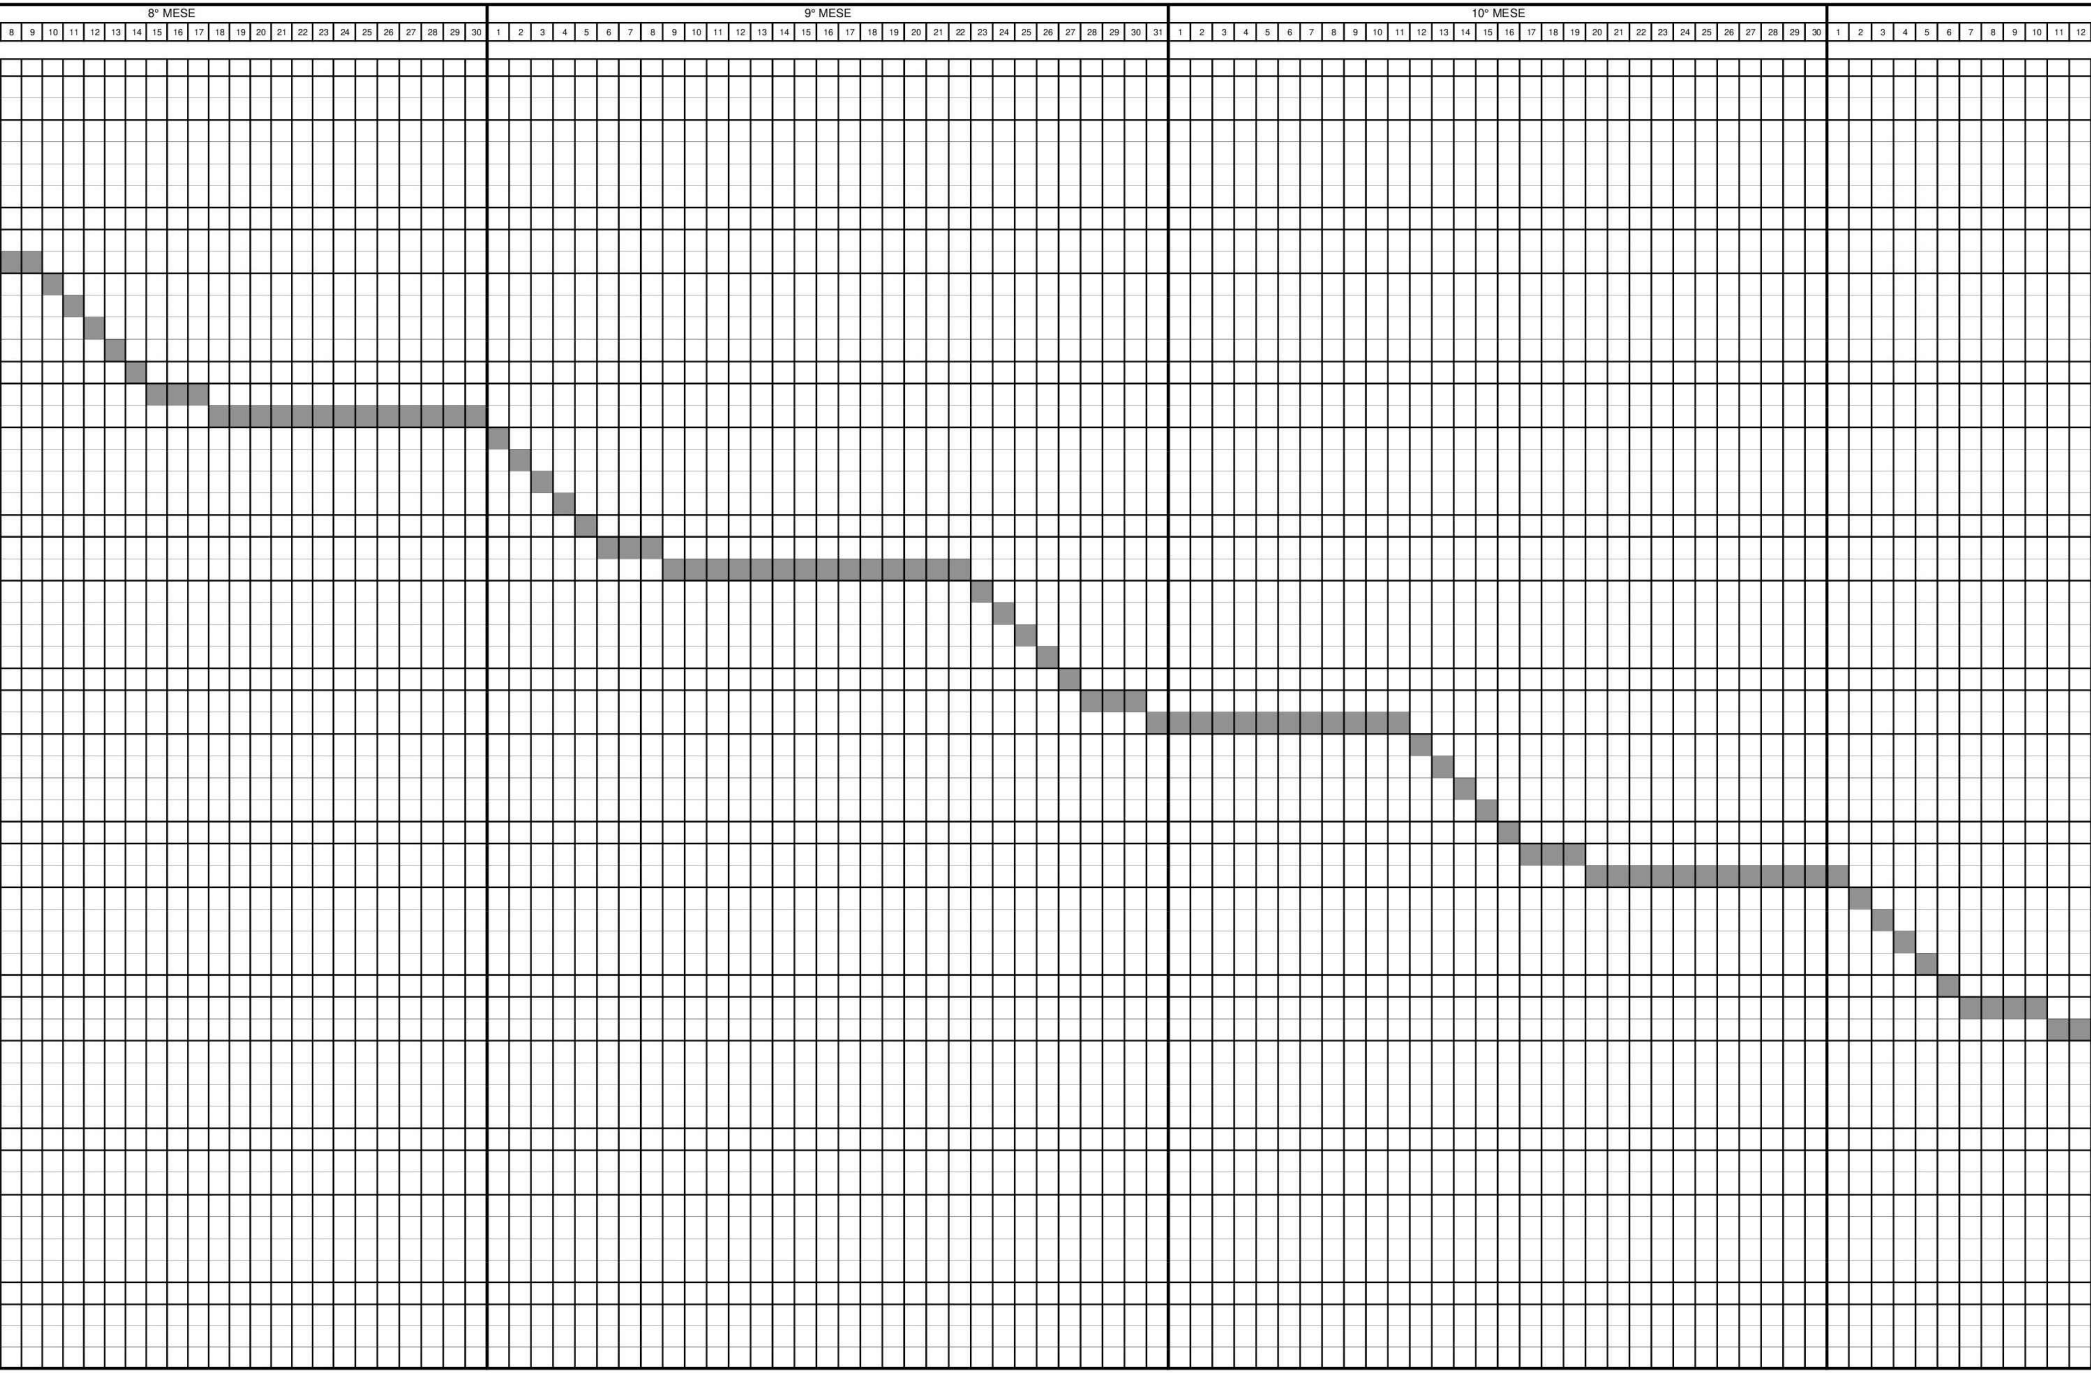

5498	5498	4498
12500	23500	21300
35500	33500	23235
35020	3200	1189
12800	12800	11500
7000	6500	6500
5200	5800	5800
113518	90798	74022

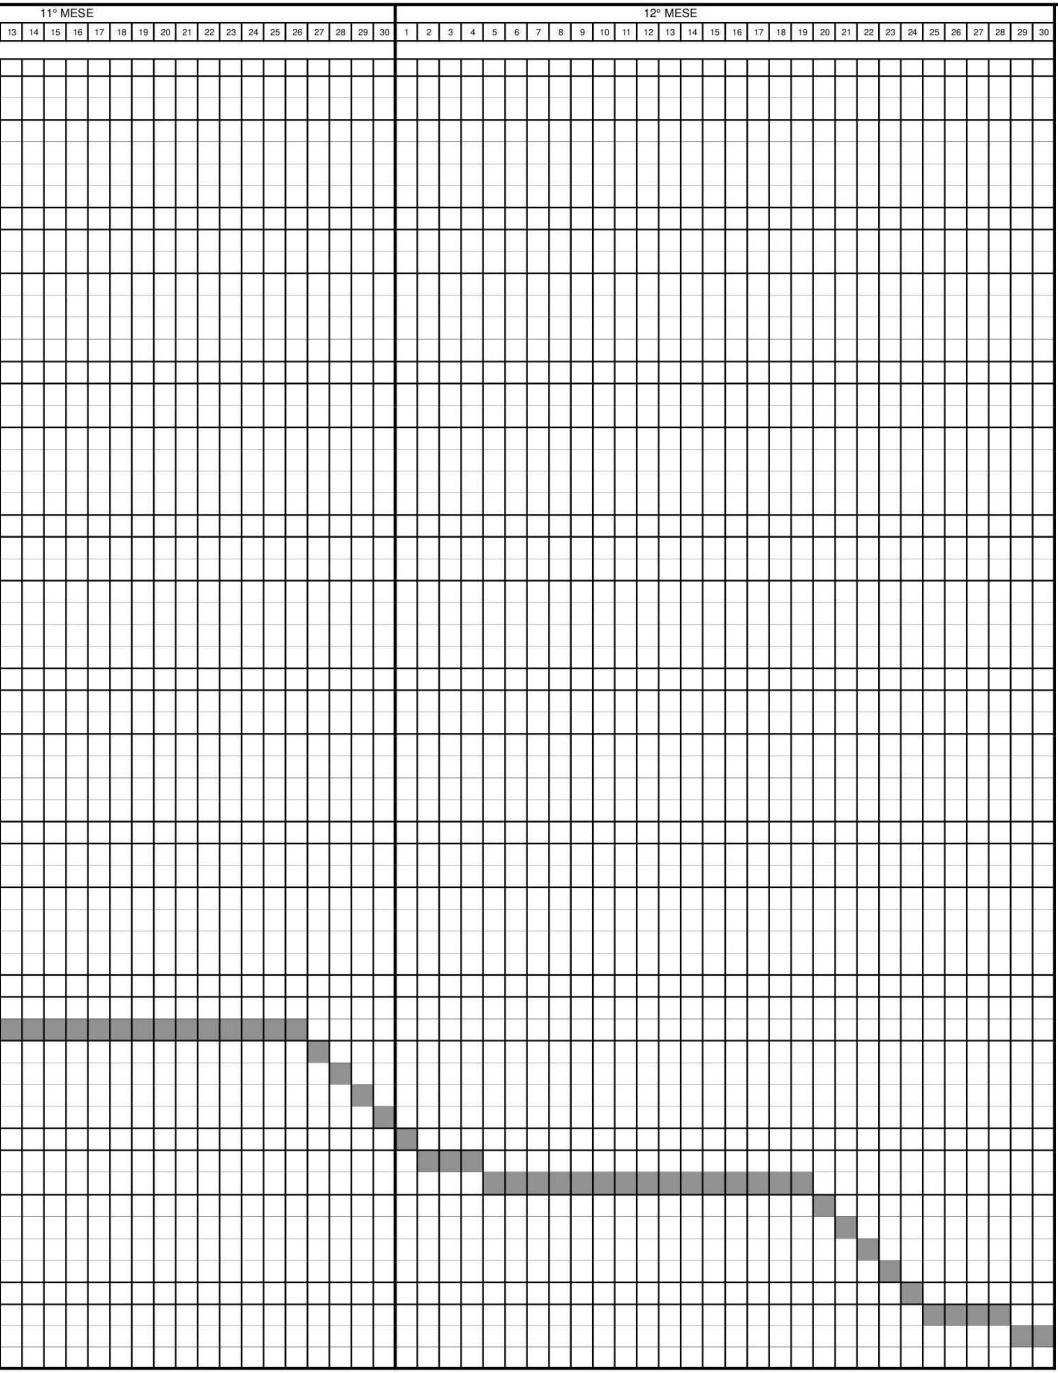

		TOTALE
4900	5500	
19800	29003	
46800	39800	
4220	3189	
12500	12500	
6500	6500	
5500	6200	
100220	102692	**1107524**
